

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

Client	: ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN Port de Galisbay BP 3218 97067 SAINT MARTIN Cedex
Chantier	: Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire
Référence du dossier	: IEP PORT GALISBAY
Dates de l'inspection	: 21/11/2022 - 30/11/2022
Distance totale inspectée	: 174.40 ml
Distance totale non inspectée	: -0.00 ml
Distance Totale	: 174.40 ml

Détection Service Relevés
Apt 28, Centre Commercial Howell Center - Galisbay
- Marigot
97150 SAINT-MARTIN
Tel: 05 90 87 44 42

SOMMAIRE

Plan de situation	3
Plan de repérage	4
Tronçon EP10 - EP11	5
Tronçon EP10 - EPG1	11
Tronçon EP11 - EP12	16
Tronçon EP11 - EPG2	23
Tronçon EP11 - EPG3	29
Tronçon EP12 - EP13	35
Tronçon EP12 - EPG4	41
Tronçon EP12 - EPG5	45
Tronçon EP13 - EP14	49
Tronçon EP13 - EPG6	55
Tronçon EP13 - EPG7	60
Tronçon EP14 - EP15	65
Tronçon EP14 - EPG8	70
Tronçon EP15 - EP16	74
Tronçon EP15 - EPG9	79
Tronçon EP16 - EPDES	85
Tronçon EP21 - EP20	88
Tronçon EP21 - EP22	94
Synthèse	99
Inventaire des observations	102

Plan de situation



ETABLISSEMENT PORTUAIRE
Galisbay - SAINT MARTIN



Plan de repérage



TRONÇON EP10 - EP11

Emplacement (AAJ) : Port de commerce
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Référence du noeud 1 (AAD) : EP10
Référence du noeud 2 (AAF) : EP11
Référence du noeud de départ (AAB) : EP10
Ville ou village (AAN) : SAINT MARTIN
Quartier (AAO) : GALISBAY
Type d'emplacement (AAL) : (Z) Sous un parking
Nom de l'inspecteur (ABH) : Ludovic DERISOUD
Heure d'inspection (ABG) : 17:39
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø400mm
Matériau (ACD) : (AX) PVC-U
Profondeur du noeud de départ (ACH) : 1.12
Profondeur du noeud d'arrivée (ACI) : 1.09
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Longueur inspectée : 15.60 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur du tronçon : 15.60 ml
Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Date d'inspection (ABF) : 21/11/2022
Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection



Distance
0.00 ml

Pente
0.0 mm/m

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = EP10



Gravité :         Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire



Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 5 / 103

TRONÇON EP10 - EP11


	Distance	Pente	Compteur
	15.50 ml	-17.3 mm/m	00:01:52

(BCA.E) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 4 heures

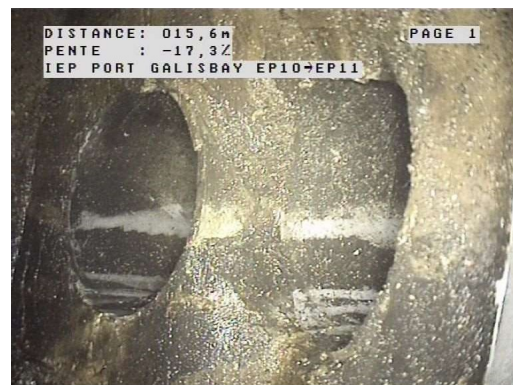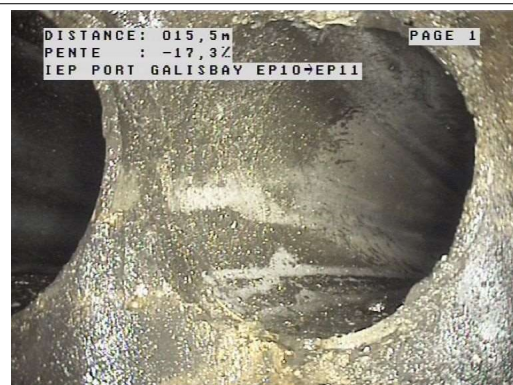

	Distance	Pente	Compteur
	15.60 ml	-17.3 mm/m	00:02:05

(BCA.E) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 3 heures

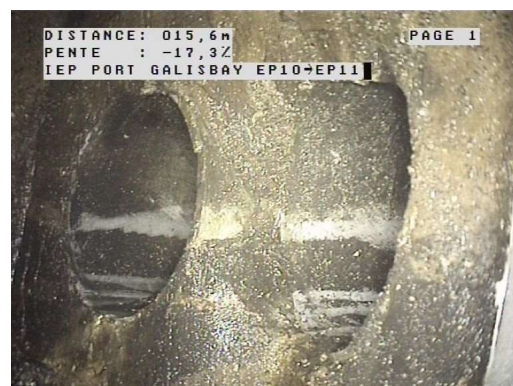

Gravité :        — Inspection : =Normal =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 6 / 103

TRONÇON EP10 - EP11

	Distance	Pente	Compteur
	15.60 ml	-17.3 mm/m	00:02:23
(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = EP11			
 			

Gravité :        — Inspection : =Normal =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 7 / 103

DÉNIVELLATION EP10 - EP11


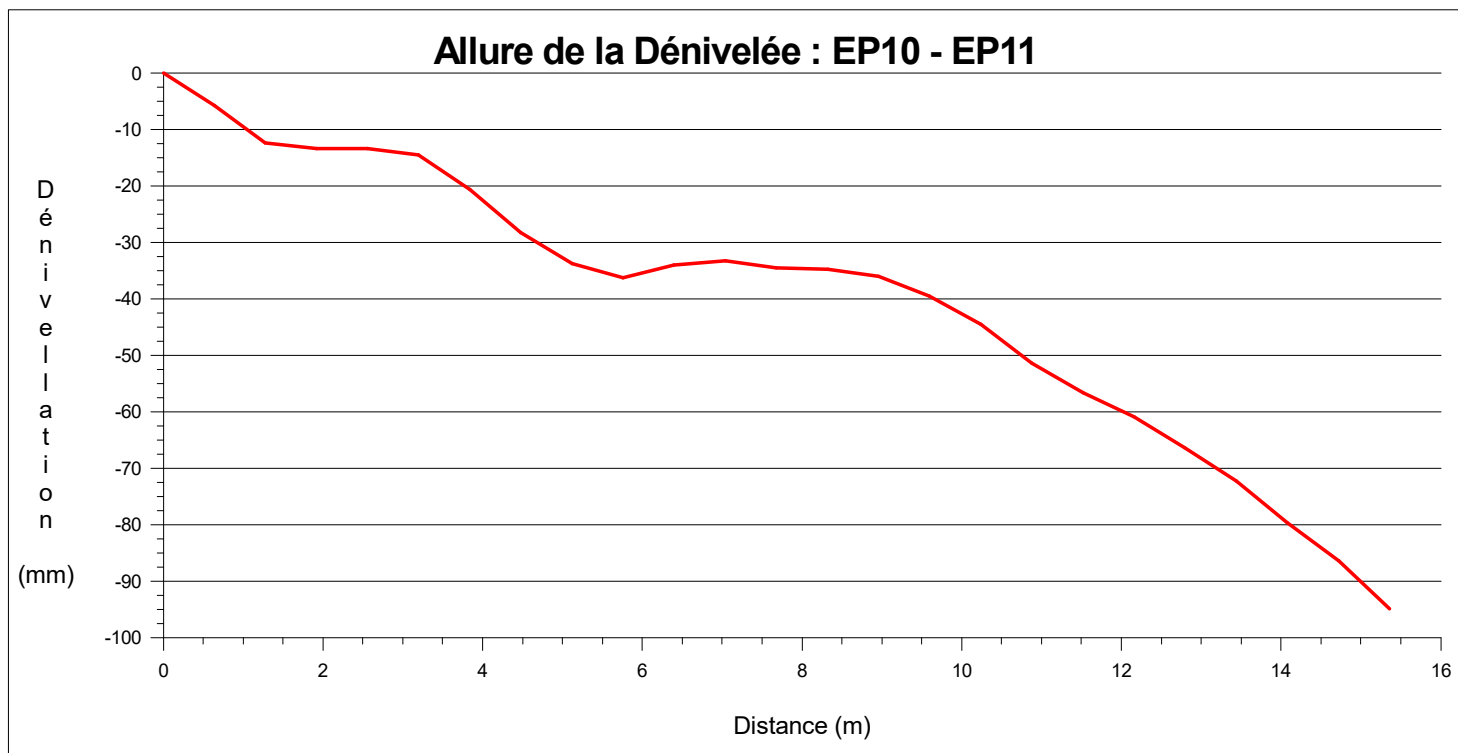


SCHÉMA DU TRONÇON EP10 - EP11

Observations du tronçon



0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - EP10



15.50 ml (BCA.E) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 4 heures

15.60 ml (BCA.E) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 3 heures

15.60 ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - EP11

Gravité : +



Départ de l'inspection : 

Non inspecté : 

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 9 / 103

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP10 - EP11

Tronçon : EP10 - EP11 Longueur du tronçon = 15.60ml		Dimension = Ø400mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP10 → EP11	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP10	
15.50	EP10 → EP11	BCA.E	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 4 heures	
15.60	EP10 → EP11	BCA.E	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 3 heures	
15.60	EP10 → EP11	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=EP11	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 10 / 103

TRONÇON EP10 - EPG1

Emplacement (AAJ) : Port de commerce
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Référence du noeud 1 (AAD) : EP10
Référence du noeud 2 (AAF) : EPG1
Référence du noeud de départ (AAB) : EP10
Ville ou village (AAN) : SAINT MARTIN
Quartier (AAO) : GALISBAY
Type d'emplacement (AAL) : (Z) Sous un parking
Nom de l'inspecteur (ABH) : Ludovic DERISOUD
Heure d'inspection (ABG) : 17:54
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø200mm
Matériau (ACD) : (AX) PVC-U
Profondeur du noeud de départ (ACH) : 1.06
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Longueur inspectée : 10.50 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur du tronçon : 10.50 ml
Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Point de référence longitudinal (ABC) : (B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Date d'inspection (ABF) : 21/11/2022
Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection




Distance
0.00 ml

Pente
0.0 mm/m

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = EP10

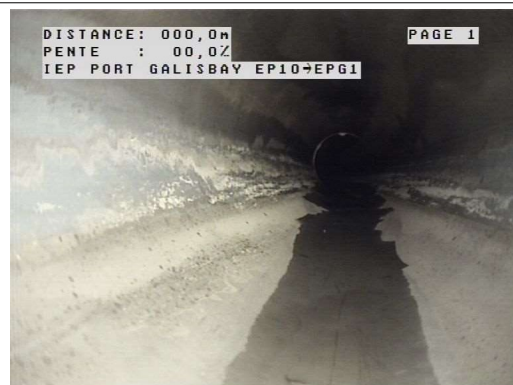


Gravité :        — Inspection :  =Normal  =Inverse


Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire


Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 11 / 103

TRONÇON EP10 - EPG1

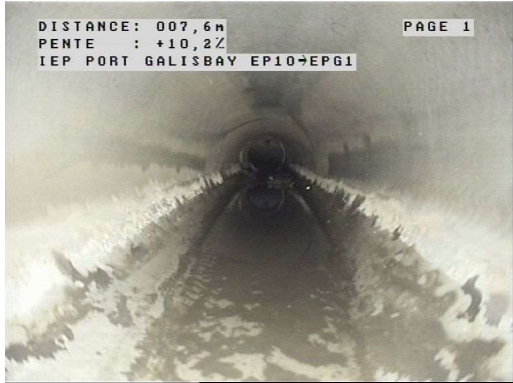	Distance 7.60 ml	Pente 10.2 mm/m	Compteur 00:00:53	DISTANCE: 007,6m PENTE : +10,2‰ IEP PORT GALISBAY EP10→EPG1 
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) Niveau = 5%				

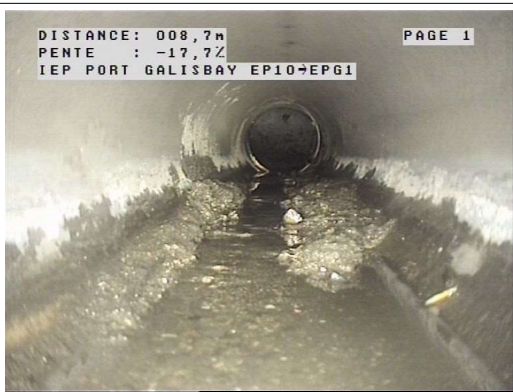	Distance 8.70 ml	Pente -17.7 mm/m	Compteur 00:01:11	DISTANCE: 008,7m PENTE : -17,7‰ IEP PORT GALISBAY EP10→EPG1 
(BBC.A) Dépôts - fin Epaisseur des dépôts = 5%				

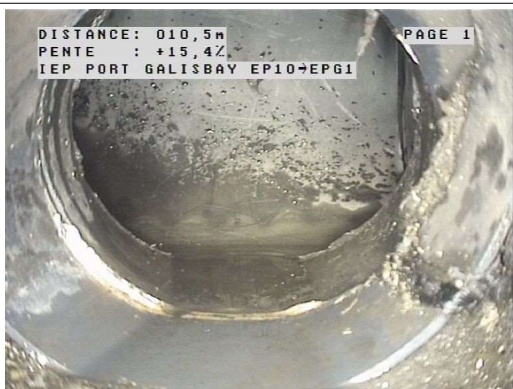	Distance 10.50 ml	Pente 15.4 mm/m	Compteur 00:01:50	DISTANCE: 010,5m PENTE : +15,4‰ IEP PORT GALISBAY EP10→EPG1  DISTANCE: 010,5m PENTE : +15,4‰ IEP PORT GALISBAY EP10→EPG1 
(BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille Référence du noeud = EPG1				

Gravité :        — Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 12 / 103

DÉNIVELLATION EP10 - EPG1


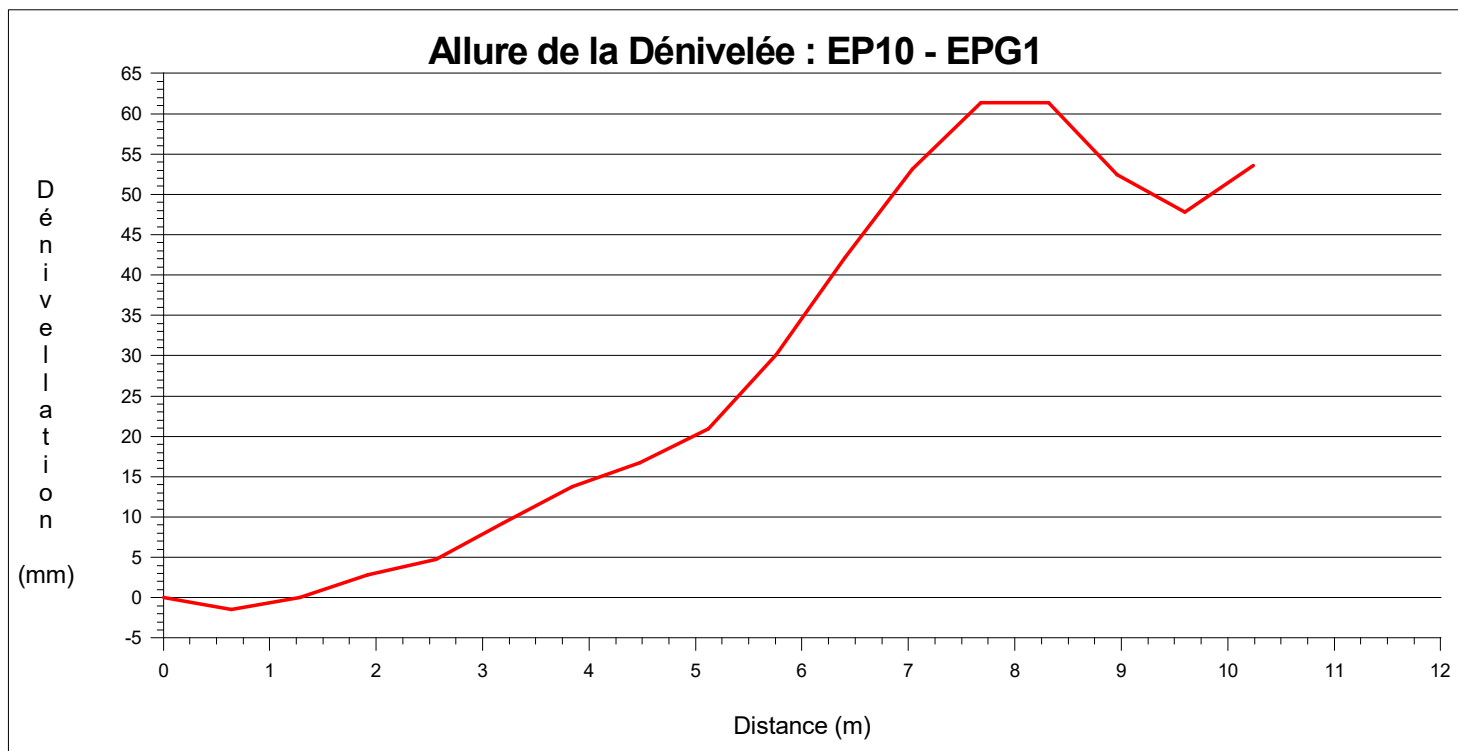


SCHÉMA DU TRONÇON EP10 - EPG1

Observations du tronçon



0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - EP10



7.60 ml (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1)

8.70 ml (BBC.A) Dépôts - fin



10.50 ml (BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille - EPG1

Gravité : +



Départ de l'inspection : ➤

Non inspecté : ■

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 14 / 103

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP10 - EPG1

Tronçon : EP10 - EPG1 Longueur du tronçon = 10.50ml		Dimension = Ø200mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP10 → EPG1	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP10	
7.60	EP10 → EPG1	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=5%	
8.70	EP10 → EPG1	BBC.A	Dépôts - fin : Epaisseur des dépôts=5%	
10.50	EP10 → EPG1	BCE.Z	Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille : Référence du noeud=EPG1	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 15 / 103

TRONÇON EP11 - EP12

Emplacement (AAJ) : Port de commerce
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Référence du noeud 1 (AAD) : EP11
Référence du noeud 2 (AAF) : EP12
Référence du noeud de départ (AAB) : EP11
Ville ou village (AAN) : SAINT MARTIN
Quartier (AAO) : GALISBAY
Type d'emplacement (AAL) : (Z) Sous un parking
Nom de l'inspecteur (ABH) : Ludovic DERISOUD
Heure d'inspection (ABG) : 18:14
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø400mm
Matériau (ACD) : (AX) PVC-U
Profondeur du noeud de départ (ACH) : 1.09
Profondeur du noeud d'arrivée (ACI) : 0.95
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Longueur inspectée : 20.10 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur du tronçon : 20.10 ml
Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Date d'inspection (ABF) : 21/11/2022
Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection



Distance
0.00 ml

Pente
0.0 mm/m

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = EP11



Gravité :        — Inspection :  =Normal  =Inverse


Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire


Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY


N° de Page : 16 / 103

TRONÇON EP11 - EP12

	Distance	Pente	Compteur	DISTANCE: 000,0m PENTE : 00,0% IEP PORT GALISBAY EP11→EP12 PAGE 1 
	0.00 ml	0.0 mm/m	00:00:01	
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) Niveau = 5%				

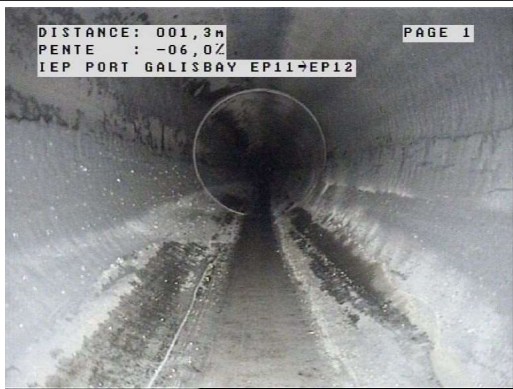	Distance	Pente	Compteur	DISTANCE: 001,3m PENTE : -06,0% IEP PORT GALISBAY EP11→EP12 PAGE 1 
	1.30 ml	-6.0 mm/m	00:00:10	
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) Niveau = 5%				

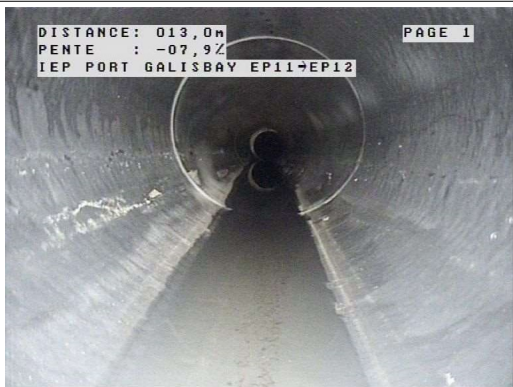	Distance	Pente	Compteur	DISTANCE: 013,0m PENTE : -07,9% IEP PORT GALISBAY EP11→EP12 PAGE 1 
	13.00 ml	-7.9 mm/m	00:01:04	
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 2) Niveau = 5%				

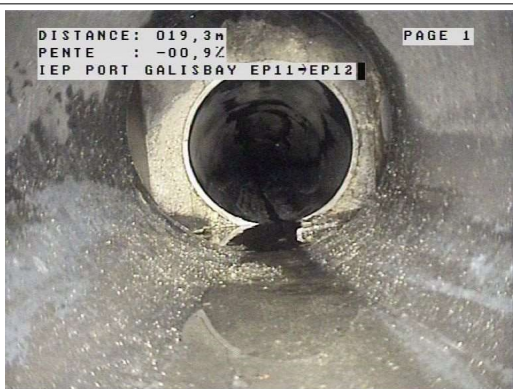	Distance	Pente	Compteur	DISTANCE: 019,3m PENTE : -00,9% IEP PORT GALISBAY EP11→EP12 PAGE 1 
	19.30 ml	-0.9 mm/m	00:01:39	
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 2) Niveau = 5%				


Gravité :         Inspection : =Normal =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 17 / 103

TRONÇON EP11 - EP12

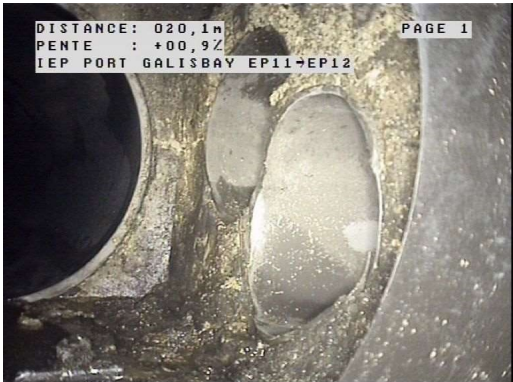	Distance	Pente	Compteur
	20.10 ml	0.9 mm/m	00:02:25
(BCA.E) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 4 heures			
			
			

	Distance	Pente	Compteur
	20.10 ml	0.9 mm/m	00:02:40
(BCA.E) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 3 heures			
			
			


Gravité :        — Inspection : =Normal =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 18 / 103

TRONÇON EP11 - EP12

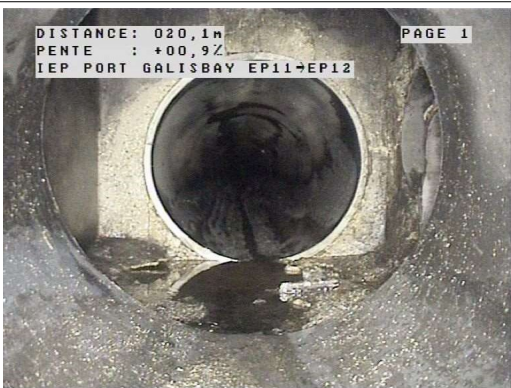	Distance	Pente	Compteur
	20.10 ml	0.9 mm/m	00:02:56
(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = EP12			
 			

Gravité :         Inspection : =Normal =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 19 / 103

DÉNIVELLATION EP11 - EP12


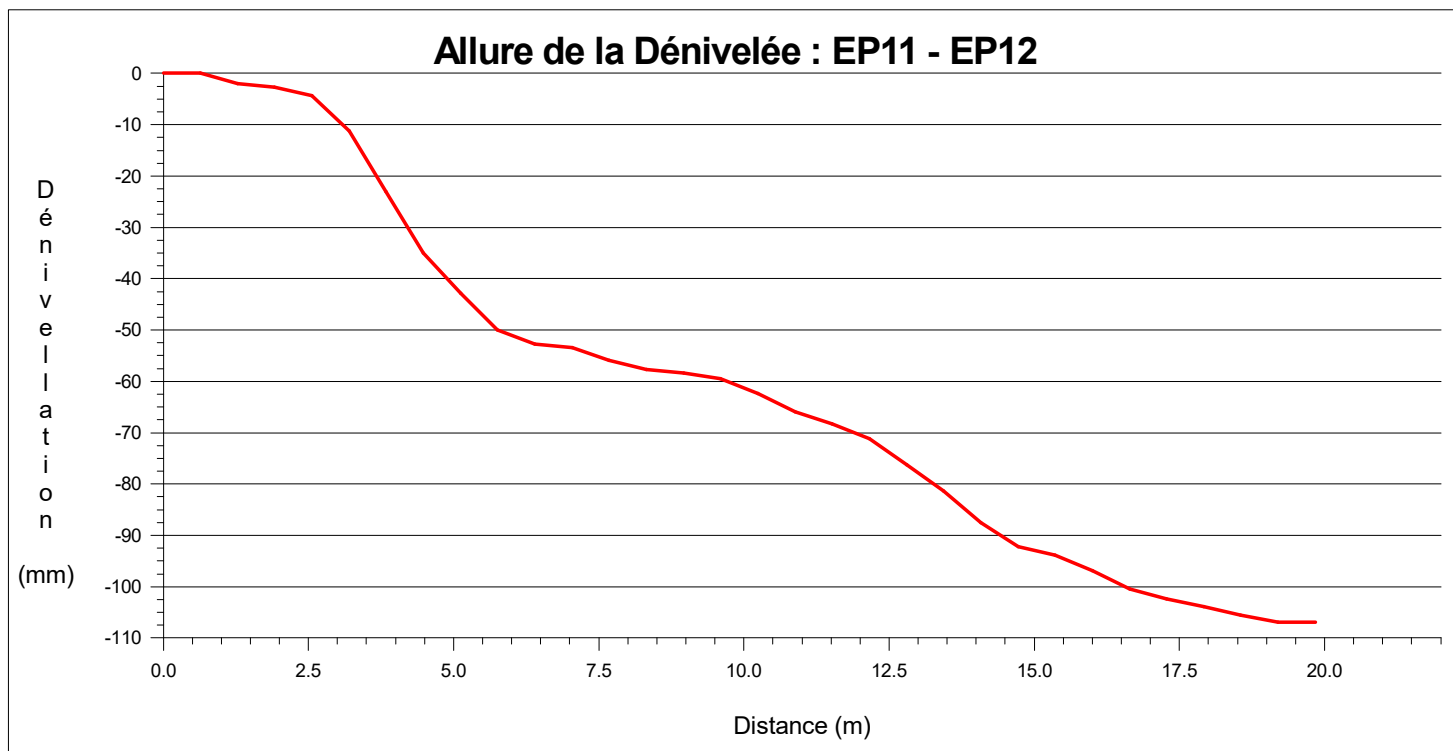


SCHÉMA DU TRONÇON EP11 - EP12

Observations du tronçon

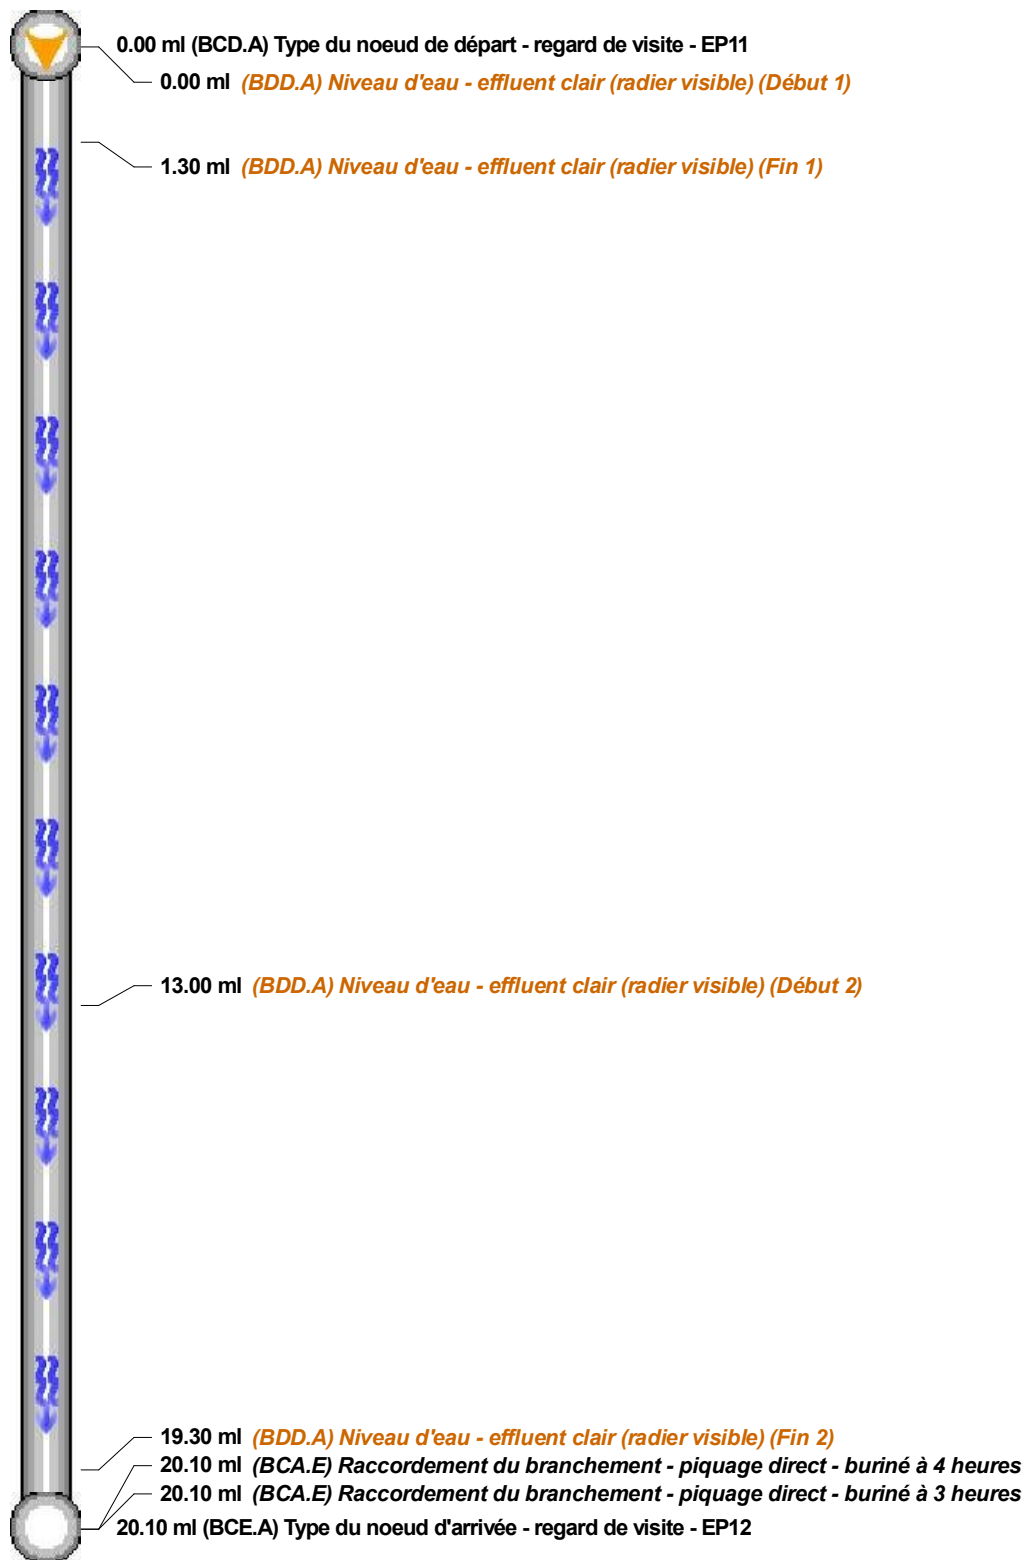

Gravité : Départ de l'inspection : Non inspecté :

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 21 / 103

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP11 - EP12

Tronçon : EP11 - EP12 Longueur du tronçon = 20.10ml		Dimension = Ø400mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP11 → EP12	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP11	
0.00	EP11 → EP12	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=5%	
1.30	EP11 → EP12	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) : Niveau=5%	
13.00	EP11 → EP12	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 2) : Niveau=5%	
19.30	EP11 → EP12	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 2) : Niveau=5%	
20.10	EP11 → EP12	BCA.E	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 4 heures	
20.10	EP11 → EP12	BCA.E	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 3 heures	
20.10	EP11 → EP12	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=EP12	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 22 / 103

TRONÇON EP11 - EPG2

Emplacement (AAJ) : Port de commerce
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Référence du noeud 1 (AAD) : EP11
Référence du noeud 2 (AAF) : EPG2
Référence du noeud de départ (AAB) : EP11
Ville ou village (AAN) : SAINT MARTIN
Quartier (AAO) : GALISBAY
Type d'emplacement (AAL) : (Z) Sous un parking
Nom de l'inspecteur (ABH) : Ludovic DERISOUD
Heure d'inspection (ABG) : 19:30
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø200mm
Matériau (ACD) : (AX) PVC-U
Profondeur du noeud de départ (ACH) : 0.98
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Longueur inspectée : 10.10 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur du tronçon : 10.10 ml
Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Point de référence longitudinal (ABC) : (B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Date d'inspection (ABF) : 21/11/2022
Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection



Distance

0.00 ml

Pente

0.0 mm/m

Compteur

00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite

Référence du noeud = EP11




Gravité :        — Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire


Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY


N° de Page : 23 / 103

TRONÇON EP11 - EPG2

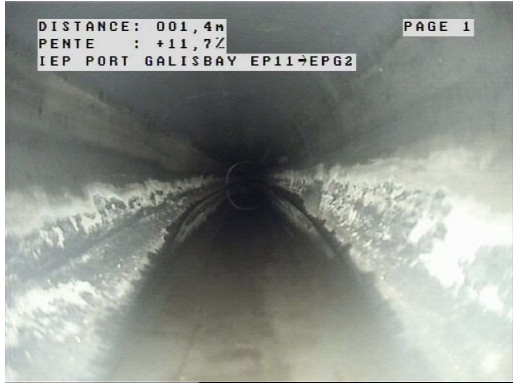	Distance 1.40 ml	Pente 11.7 mm/m	Compteur 00:00:14	DISTANCE: 001,4m PENTE : +11,7% IEP PORT GALISBAY EP11→EPG2 PAGE 1 
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) Niveau = 10%				

	Distance 2.70 ml	Pente -21.9 mm/m	Compteur 00:00:34	DISTANCE: 002,7m PENTE : -21,9% IEP PORT GALISBAY EP11→EPG2 PAGE 1 
(BDD.C) Niveau d'eau - troubles (Début 2) Niveau = 40%				

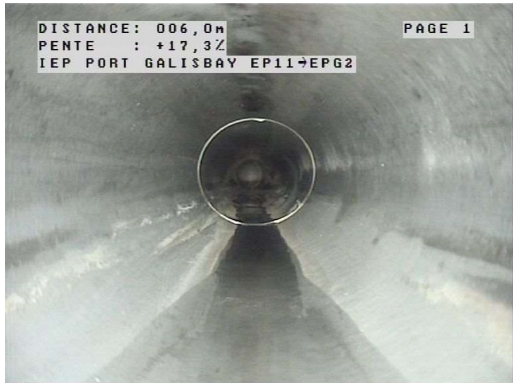	Distance 5.30 ml	Pente -4.6 mm/m	Compteur 00:01:06	DISTANCE: 006,0m PENTE : +17,3% IEP PORT GALISBAY EP11→EPG2 PAGE 1 
(BDD.C) Niveau d'eau - troubles (Fin 2) Niveau = 40%				

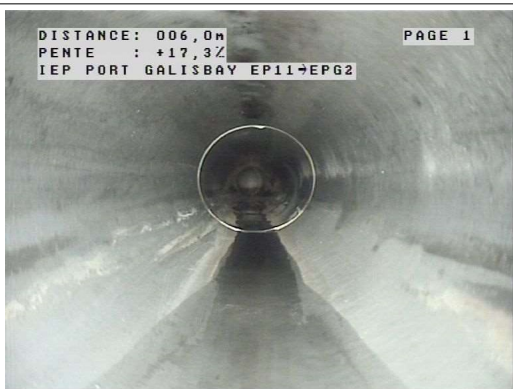	Distance 6.00 ml	Pente 17.3 mm/m	Compteur 00:01:14	DISTANCE: 006,0m PENTE : +17,3% IEP PORT GALISBAY EP11→EPG2 PAGE 1 
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) Niveau = 10%				

Gravité :        — Inspection : =Normal =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire


Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 24 / 103

TRONÇON EP11 - EPG2

Distance	Pente	Compteur
8.60 ml	-4.6 mm/m	00:01:40

(BAF.K.A) Dégradation de surface - poinçonnement (renflement interne) - mécanique à 7 heures

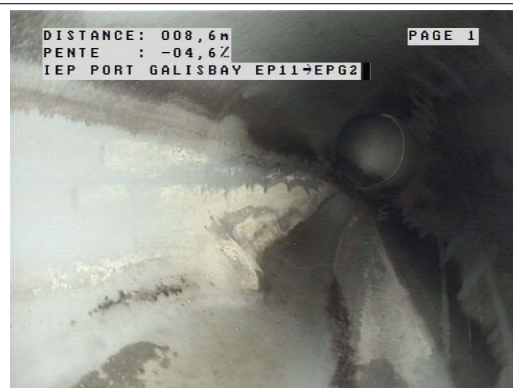

Distance	Pente	Compteur
10.10 ml	26.6 mm/m	00:02:10

(BCC.A) Courbure du collecteur - vers la gauche

Angle de déviation = 45°

(BDC.Z) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Courbure du collecteur trop importante pour passage de la caméra



Distance	Pente	Compteur
10.10 ml	26.6 mm/m	00:02:39

(BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille

Référence du noeud = EPG2



Gravité :         Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 25 / 103

DÉNIVELLATION EP11 - EPG2

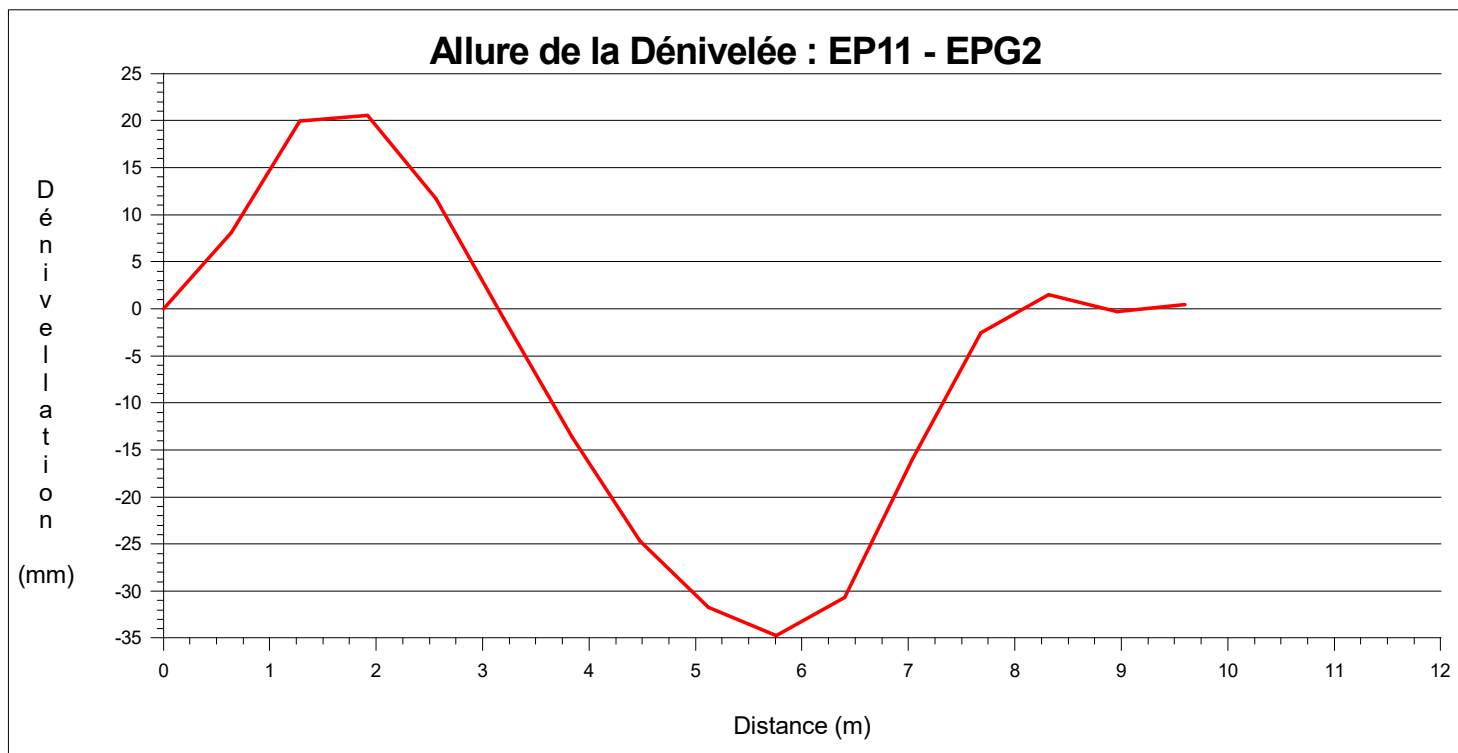


SCHÉMA DU TRONÇON EP11 - EPG2

Observations du tronçon



Gravité : Départ de l'inspection : Non inspecté :

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 27 / 103

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP11 - EPG2

Tronçon : EP11 - EPG2 Longueur du tronçon = 10.10ml		Dimension = Ø200mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP11 → EPG2	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP11	
1.40	EP11 → EPG2	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=10%	
2.70	EP11 → EPG2	BDD.C	Niveau d'eau - troubles (Début 2) : Niveau=40%	
5.30	EP11 → EPG2	BDD.C	Niveau d'eau - troubles (Fin 2) : Niveau=40%	
6.00	EP11 → EPG2	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) : Niveau=10%	
8.60	EP11 → EPG2	BAF.K.A	Dégradation de surface - poinçonnement (renflement interne) - mécanique à 7 heures	
10.10	EP11 → EPG2	BCC.A	Courbure du collecteur - vers la gauche : Angle de déviation=45°	
10.10	EP11 → EPG2	BDC.Z	Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Courbure du collecteur trop importante pour passage de la caméra	
10.10	EP11 → EPG2	BCE.Z	Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille : Référence du noeud=EPG2	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 28 / 103

TRONÇON EP11 - EPG3

Emplacement (AAJ) : Port de commerce
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Référence du noeud 1 (AAD) : EP11
Référence du noeud 2 (AAF) : EPG3
Référence du noeud de départ (AAB) : EP11
Ville ou village (AAN) : SAINT MARTIN
Quartier (AAO) : GALISBAY
Type d'emplacement (AAL) : (Z) Sous un parking
Nom de l'inspecteur (ABH) : Ludovic DERISOUD
Heure d'inspection (ABG) : 19:09
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø200mm
Matériau (ACD) : (AX) PVC-U
Profondeur du noeud de départ (ACH) : 1.00
Profondeur du noeud d'arrivée (ACI) : 0.94
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Longueur inspectée : 6.40 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur du tronçon : 6.40 ml
Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Point de référence longitudinal (ABC) : (B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Date d'inspection (ABF) : 21/11/2022
Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection




Distance
0.00 ml

Pente
0.0 mm/m

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = EP11

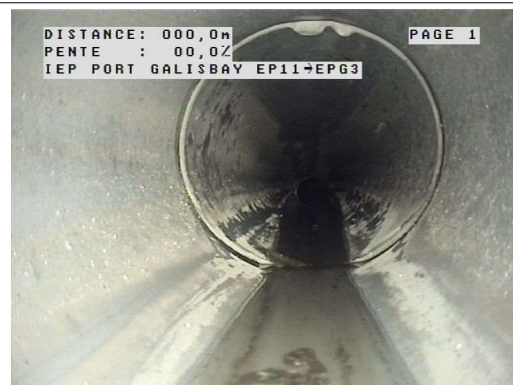

Gravité :         Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 29 / 103

TRONÇON EP11 - EPG3

	Distance	Pente	Compteur	DISTANCE: 000,0m PENTE : 00,0% IEP PORT GALISBAY EP11→EPG3 
	0.00 ml	0.0 mm/m	00:00:10	
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) Niveau = 10%				

	Distance	Pente	Compteur	DISTANCE: -000,1m PENTE : 00,0% IEP PORT GALISBAY EP11→EPG3 
	0.10 ml	0.0 mm/m	00:00:23	
(BDD.C) Niveau d'eau - troubles (Début 2) Niveau = 50%				

	Distance	Pente	Compteur	DISTANCE: 002,9m PENTE : +21,5% IEP PORT GALISBAY EP11→EPG3 
	2.90 ml	21.5 mm/m	00:00:51	
(BDD.C) Niveau d'eau - troubles (Fin 2) Niveau = 50%				

	Distance	Pente	Compteur	DISTANCE: 004,0m PENTE : +30,4% IEP PORT GALISBAY EP11→EPG3 
	4.00 ml	30.4 mm/m	00:01:07	
(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) Niveau = 10%				


Gravité :         Inspection : =Normal =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 30 / 103

TRONÇON EP11 - EPG3

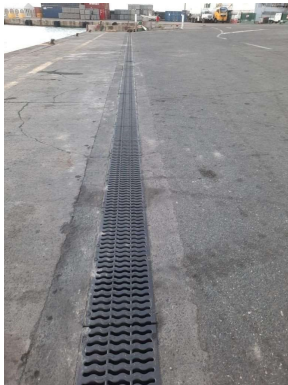	Distance	Pente	Compteur
	6.40 ml	57.0 mm/m	00:01:46
(BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille Référence du noeud = EPG3			
 			

Gravité :        — Inspection : =Normal =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 31 / 103

DÉNIVELLATION EP11 - EPG3

Allure de la Dénivelée : EP11 - EPG3


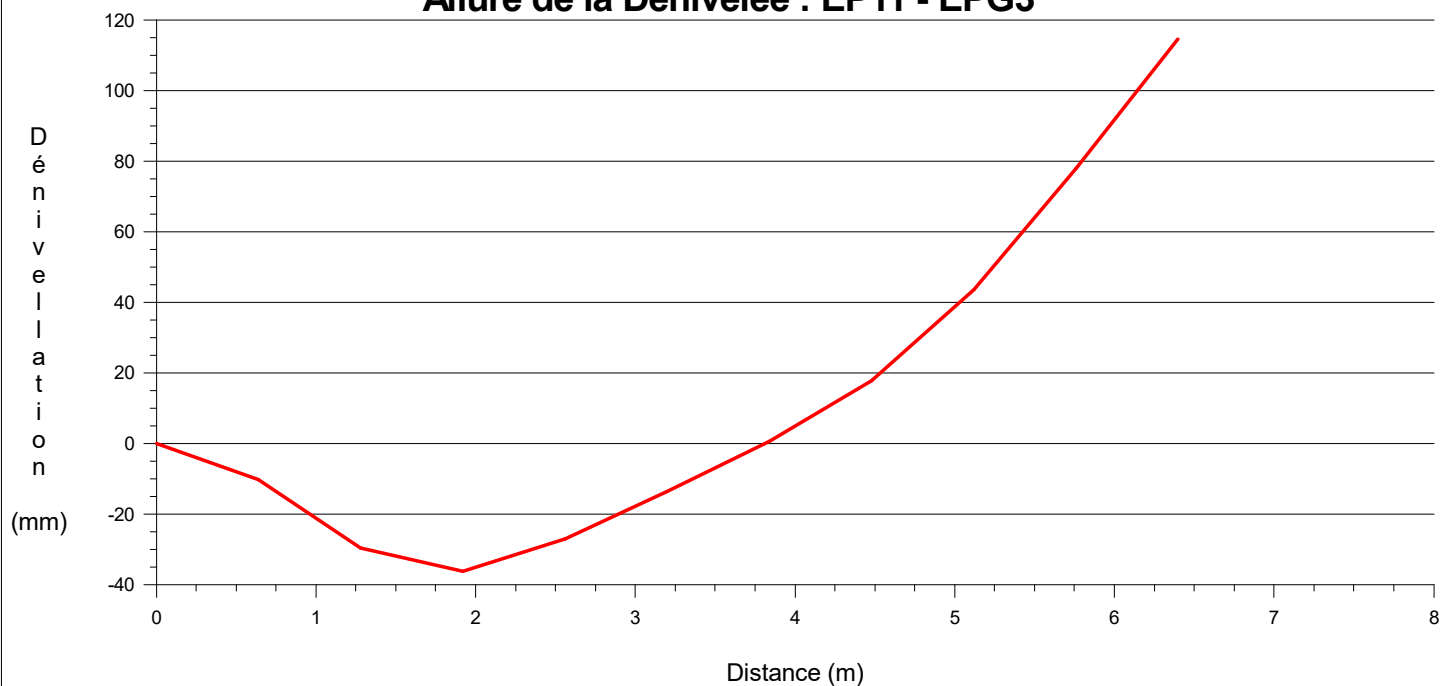


SCHÉMA DU TRONÇON EP11 - EPG3

Observations du tronçon

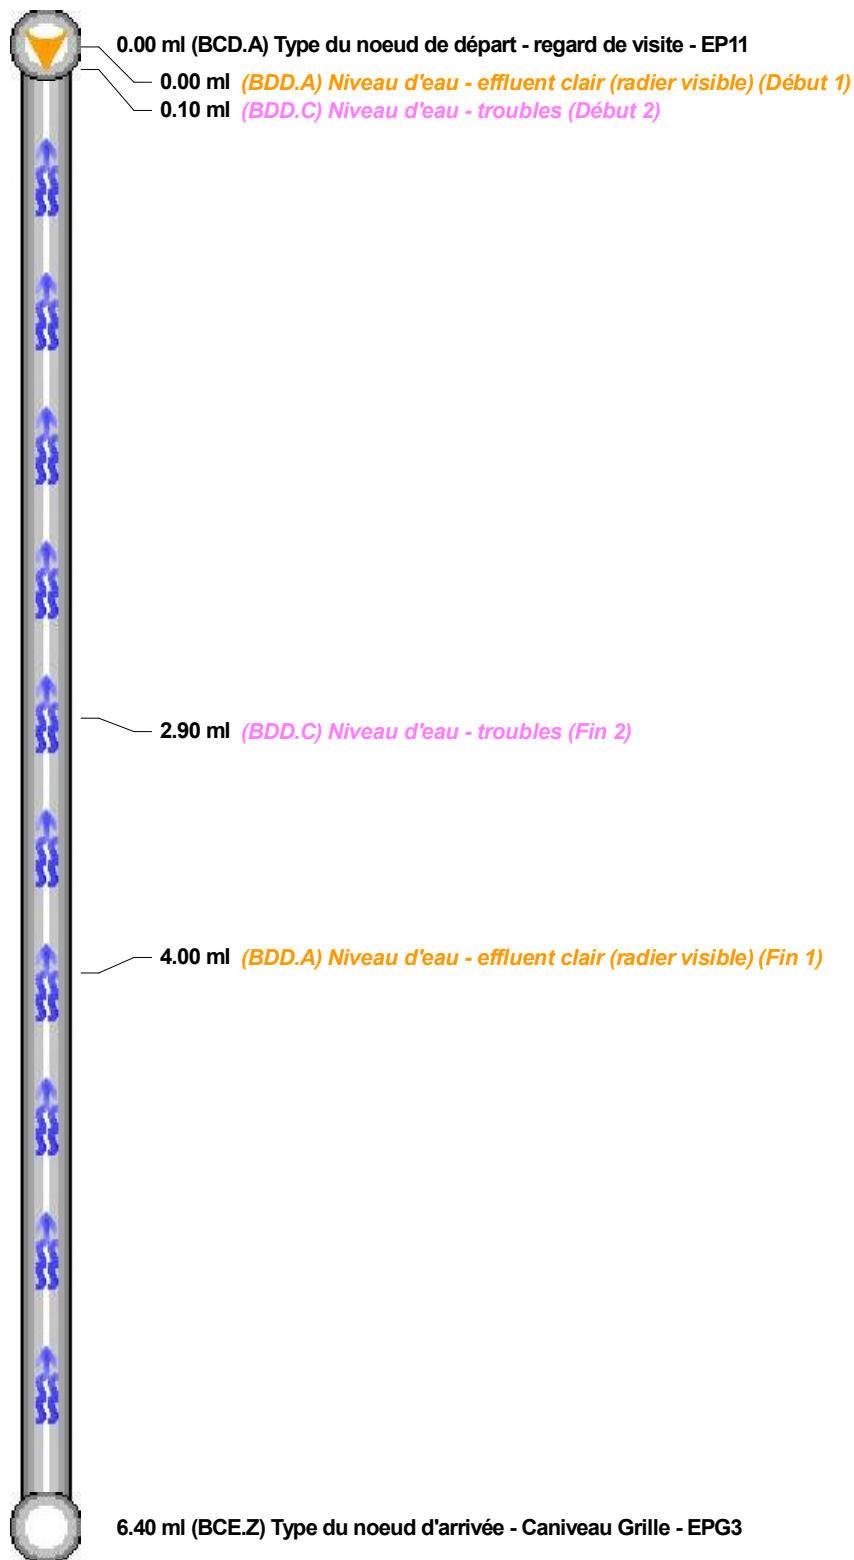

Gravité : **+**        Départ de l'inspection :  Non inspecté : 

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 33 / 103

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP11 - EPG3

Tronçon : EP11 - EPG3 Longueur du tronçon = 6.40ml		Dimension = Ø200mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP11 → EPG3	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP11	
0.00	EP11 → EPG3	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=10%	
0.10	EP11 → EPG3	BDD.C	Niveau d'eau - troubles (Début 2) : Niveau=50%	
2.90	EP11 → EPG3	BDD.C	Niveau d'eau - troubles (Fin 2) : Niveau=50%	
4.00	EP11 → EPG3	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) : Niveau=10%	
6.40	EP11 → EPG3	BCE.Z	Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille : Référence du noeud=EPG3	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 34 / 103

TRONÇON EP12 - EP13

Emplacement (AAJ) : Port de commerce
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Référence du noeud 1 (AAD) : EP12
Référence du noeud 2 (AAF) : EP13
Référence du noeud de départ (AAB) : EP12
Ville ou village (AAN) : SAINT MARTIN
Quartier (AAO) : GALISBAY
Type d'emplacement (AAL) : (Z) Sous un parking
Nom de l'inspecteur (ABH) : Ludovic DERISOUD
Heure d'inspection (ABG) : 18:37
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø400mm
Matériau (ACD) : (AX) PVC-U
Profondeur du noeud de départ (ACH) : 0.95
Profondeur du noeud d'arrivée (ACI) : 0.94
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Longueur inspectée : 19.80 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur du tronçon : 19.80 ml
Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Date d'inspection (ABF) : 21/11/2022
Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection



Distance

0.00 ml

Pente


0.0 mm/m

Compteur

00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite

Référence du noeud = EP12

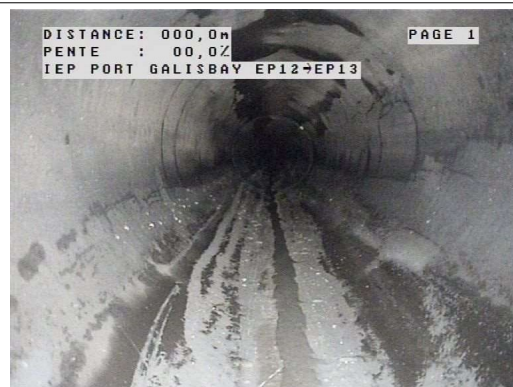

Gravité :         Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire


Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 35 / 103

TRONÇON EP12 - EP13


	Distance	Pente	Compteur
	19.70 ml	1.4 mm/m	00:02:05

(BCA.E) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 4 heures

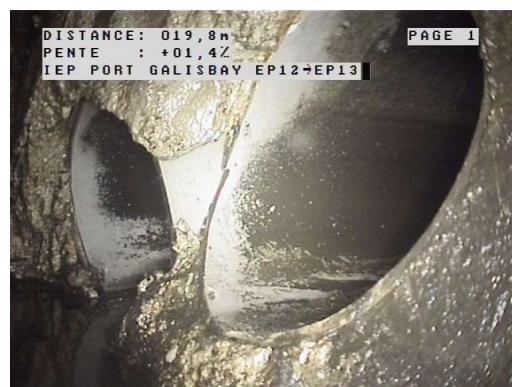

	Distance	Pente	Compteur
	19.80 ml	1.4 mm/m	00:02:14

(BCA.E) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 3 heures

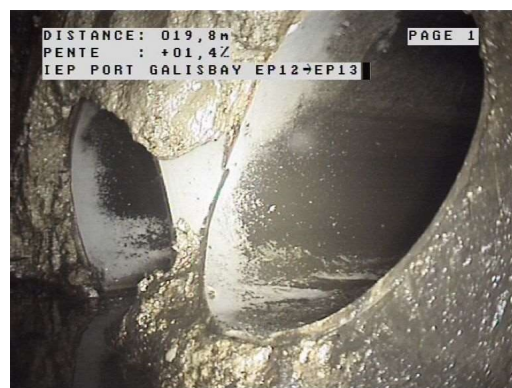


Gravité :        — Inspection : =Normal =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 36 / 103

TRONÇON EP12 - EP13

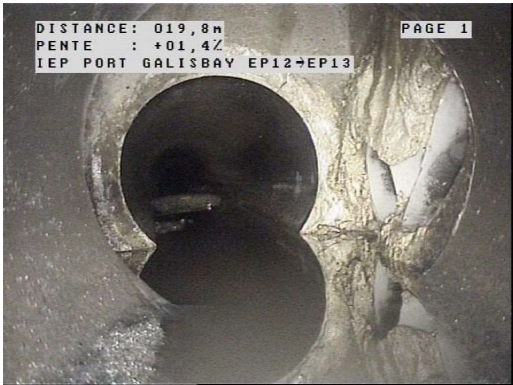	Distance	Pente	Compteur
	19.80 ml	1.4 mm/m	00:02:34
(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = EP13			
 			

Gravité :        — Inspection : =Normal =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 37 / 103

DÉNIVELLATION EP12 - EP13

Allure de la Dénivelée : EP12 - EP13


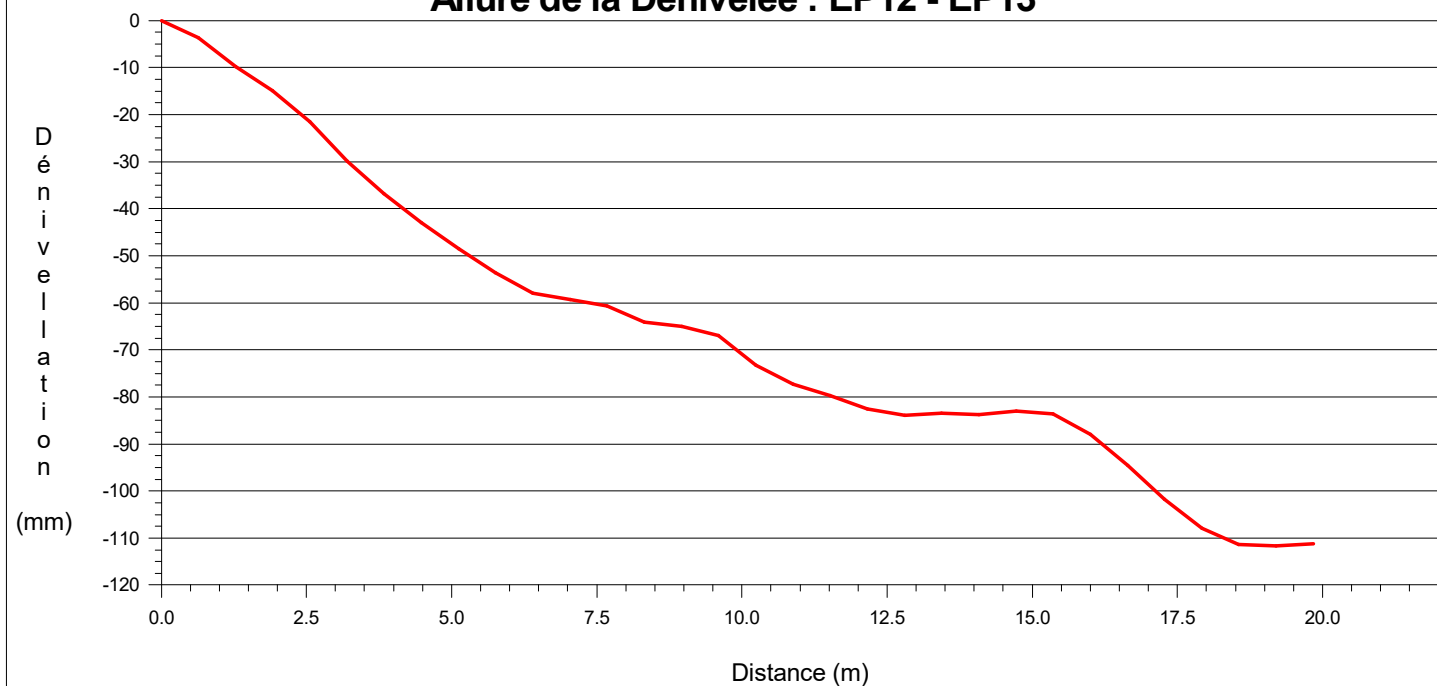


SCHÉMA DU TRONÇON EP12 - EP13

Observations du tronçon



0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - EP12



19.70 ml (BCA.E) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 4 heures

19.80 ml (BCA.E) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 3 heures

19.80 ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - EP13

Gravité : +



Départ de l'inspection : 

Non inspecté : 

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP12 - EP13

Tronçon : EP12 - EP13 Longueur du tronçon = 19.80ml		Dimension = Ø400mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP12 → EP13	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP12	
19.70	EP12 → EP13	BCA.E	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 4 heures	
19.80	EP12 → EP13	BCA.E	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 3 heures	
19.80	EP12 → EP13	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=EP13	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 40 / 103

TRONÇON EP12 - EPG4

Emplacement (AAJ) : Port de commerce
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Référence du noeud 1 (AAD) : EP12
Référence du noeud 2 (AAF) : EPG4
Référence du noeud de départ (AAB) : EP12
Ville ou village (AAN) : SAINT MARTIN
Quartier (AAO) : GALISBAY
Type d'emplacement (AAL) : (Z) Sous un parking
Nom de l'inspecteur (ABH) : Ludovic DERISOUD
Heure d'inspection (ABG) : 20:05
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø200mm
Matériau (ACD) : (AX) PVC-U
Profondeur du noeud de départ (ACH) : 0.91
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Longueur inspectée : 6.40 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur du tronçon : 6.40 ml
Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Point de référence longitudinal (ABC) : (B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Date d'inspection (ABF) : 30/11/2022
Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection



Distance

0.00 ml

Pente

0.0 mm/m

Compteur

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite

Référence du noeud = EP12



Gravité :        


Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 41 / 103

TRONÇON EP12 - EPG4

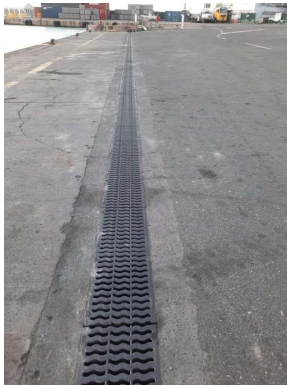	Distance	Pente	Compteur
	6.40 ml		
(BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille Référence du noeud = EPG4			
 			

Gravité :         Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY


N° de Page : 42 / 103

SCHÉMA DU TRONÇON EP12 - EPG4

Observations du tronçon



0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - EP12



6.40 ml (BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille - EPG4

Gravité :        

Départ de l'inspection : 

Non inspecté : 

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 43 / 103

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP12 - EPG4

Tronçon : EP12 - EPG4 Longueur du tronçon = 6.40ml		Dimension = Ø200mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP12 → EPG4	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP12	
6.40	EP12 → EPG4	BCE.Z	Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille : Référence du noeud=EPG4	

Tronçon :  Branchement : 

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 44 / 103

TRONÇON EP12 - EPG5

Emplacement (AAJ) : Port de commerce
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Référence du noeud 1 (AAD) : EP12
Référence du noeud 2 (AAF) : EPG5
Référence du noeud de départ (AAB) : EP12
Ville ou village (AAN) : SAINT MARTIN
Quartier (AAO) : GALISBAY
Type d'emplacement (AAL) : (Z) Sous un parking
Nom de l'inspecteur (ABH) : Ludovic DERISOUD
Heure d'inspection (ABG) : 20:10
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø200mm
Matériau (ACD) : (AX) PVC-U
Profondeur du noeud de départ (ACH) : 0.82
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Longueur inspectée : 6.10 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur du tronçon : 6.10 ml
Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Point de référence longitudinal (ABC) : (B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Date d'inspection (ABF) : 30/11/2022
Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection



Distance

0.00 ml

Pente

0.0 mm/m

Compteur

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite

Référence du noeud = EP12



Gravité :        


Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 45 / 103

TRONÇON EP12 - EPG5

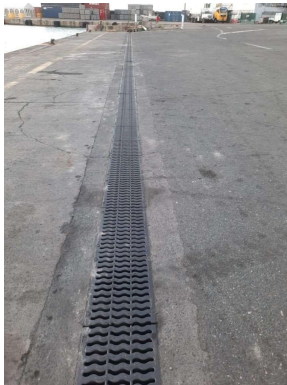	Distance	Pente	Compteur
	6.10 ml		
(BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille Référence du noeud = EPG5			
 			

Gravité :         Inspection : =Normal =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY


N° de Page : 46 / 103

SCHÉMA DU TRONÇON EP12 - EPG5

Observations du tronçon



0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - EP12



6.10 ml (BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille - EPG5

Gravité :        

Départ de l'inspection : 

Non inspecté : 

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 47 / 103

TRONÇON EP13 - EP14

Emplacement (AAJ) : Port de commerce
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Référence du noeud 1 (AAD) : EP13
Référence du noeud 2 (AAF) : EP14
Référence du noeud de départ (AAB) : EP13
Ville ou village (AAN) : SAINT MARTIN
Quartier (AAO) : GALISBAY
Type d'emplacement (AAL) : (Z) Sous un parking
Nom de l'inspecteur (ABH) : Ludovic DERISOUD
Heure d'inspection (ABG) : 20:00
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø400mm
Matériau (ACD) : (AX) PVC-U
Profondeur du noeud de départ (ACH) : 0.94
Profondeur du noeud d'arrivée (ACI) : 0.95
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Précipitations (ADA) : (B) Pluie
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Longueur inspectée : 19.20 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur du tronçon : 19.20 ml
Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Date d'inspection (ABF) : 21/11/2022
Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection



Distance
0.00 ml

Pente
0.0 mm/m

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = EP13



Gravité : +       - Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY


N° de Page : 49 / 103

TRONÇON EP13 - EP14

	Distance	Pente	Compteur
	14.50 ml	5.1 mm/m	00:01:02


(BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1)

Niveau = 5%

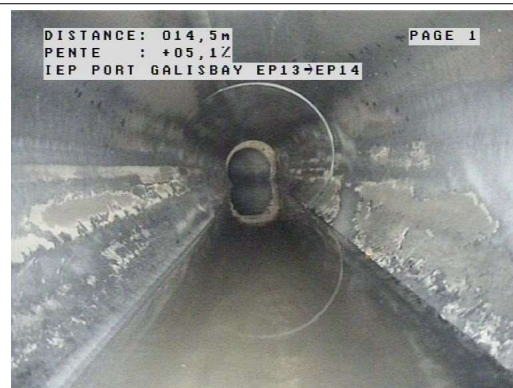

	Distance	Pente	Compteur
	19.20 ml	-12.1 mm/m	00:01:38

(BCA.E) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 3 heures

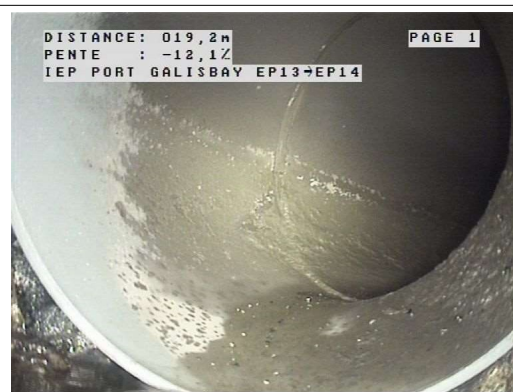

Gravité :         Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 50 / 103

TRONÇON EP13 - EP14

	Distance	Pente	Compteur
	19.20 ml	-12.1 mm/m	00:02:12
(BCE.A) Type du nœud d'arrivée - regard de visite Référence du nœud = 14			
 			

Gravité :        — Inspection : =Normal =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 51 / 103

DÉNIVELLATION EP13 - EP14


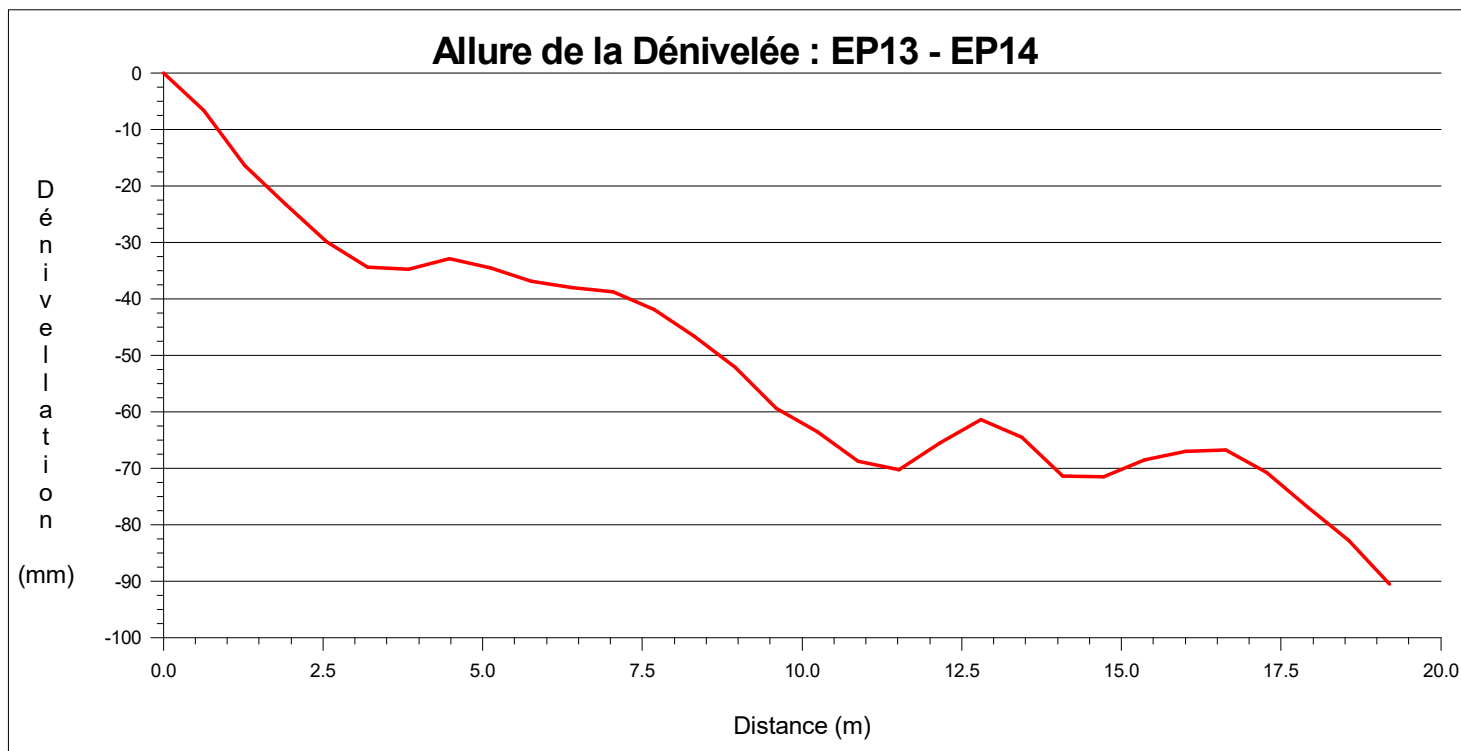


SCHÉMA DU TRONÇON EP13 - EP14

Observations du tronçon



0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - EP13



14.50 ml (BDD.A) Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1)

19.20 ml (BCA.E) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 3 heures

19.20 ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - 14

Gravité :        — Départ de l'inspection :  Non inspecté : 

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 53 / 103

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP13 - EP14

Tronçon : EP13 - EP14 Longueur du tronçon = 19.20ml		Dimension = Ø400mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP13 → EP14	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP13	
14.50	EP13 → EP14	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=5%	
19.20	EP13 → EP14	BCA.E	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 3 heures	
19.20	EP13 → EP14	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=14	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 54 / 103

TRONÇON EP13 - EPG6

Emplacement (AAJ) : Port de commerce
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Référence du noeud 1 (AAD) : EP13
Référence du noeud 2 (AAF) : EPG6
Référence du noeud de départ (AAB) : EP13
Ville ou village (AAN) : SAINT MARTIN
Quartier (AAO) : GALISBAY
Type d'emplacement (AAL) : (Z) Sous un parking
Nom de l'inspecteur (ABH) : Ludovic DERISOUD
Heure d'inspection (ABG) : 20:16
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø200mm
Matériau (ACD) : (AX) PVC-U
Profondeur du noeud de départ (ACH) : 0.84
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Longueur inspectée : 0.90 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur du tronçon : 0.90 ml
Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Point de référence longitudinal (ABC) : (B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Date d'inspection (ABF) : 21/11/2022
Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection




Distance
0.00 ml

Pente
0.0 mm/m

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = EP13

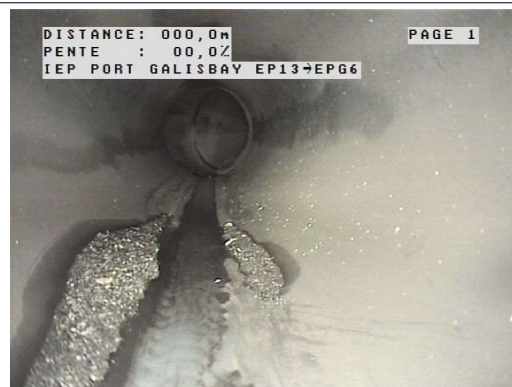


Gravité :        — Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 55 / 103

TRONÇON EP13 - EPG6

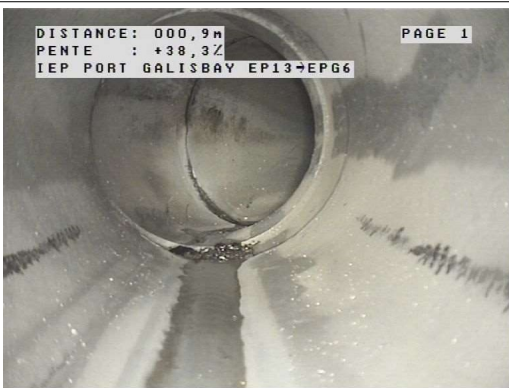	Distance	Pente	Compteur
	0.90 ml	38.3 mm/m	00:00:27
(BCC.B) Courbure du collecteur - vers la droite Angle de déviation = 45° (BDC.Z) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Courbure du collecteur trop importante pour passage de la caméra (BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille Référence du noeud = EPG6			
 			

Gravité :        — Inspection : =Normal =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 56 / 103

DÉNIVELLATION EP13 - EPG6


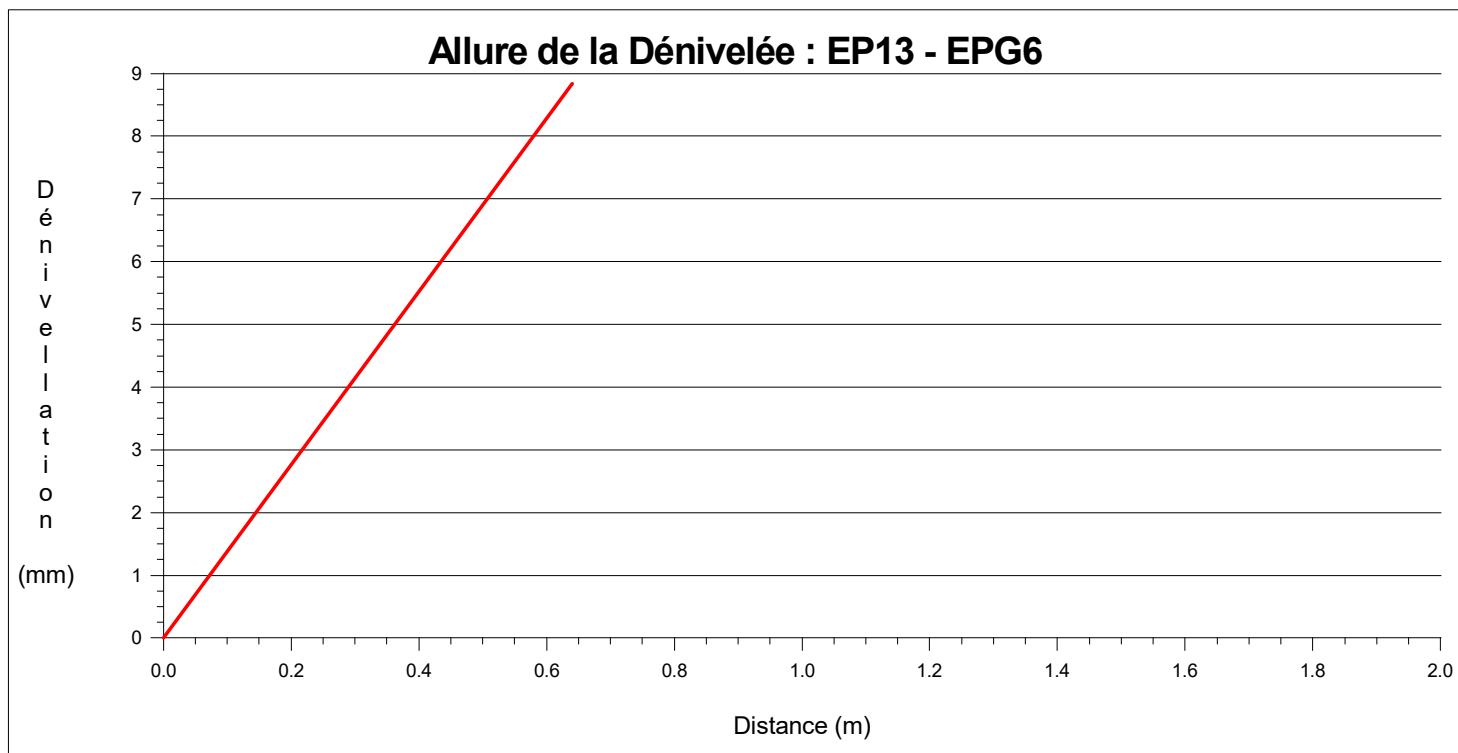


SCHÉMA DU TRONÇON EP13 - EPG6

Observations du tronçon



0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - EP13



0.90 ml (BCC.B) *Courbure du collecteur - vers la droite*

0.90 ml (BDC.Z) *Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Courbure du collecteur trop importante pour passage de la caméra*

0.90 ml (BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille - EPG6

Gravité :

Départ de l'inspection :

Non inspecté :

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 58 / 103

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP13 - EPG6

Tronçon : EP13 - EPG6 Longueur du tronçon = 0.90ml		Dimension = Ø200mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP13 → EPG6	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP13	
0.90	EP13 → EPG6	BCC.B	Courbure du collecteur - vers la droite : Angle de déviation=45°	
0.90	EP13 → EPG6	BDC.Z	Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Courbure du collecteur trop importante pour passage de la caméra	
0.90	EP13 → EPG6	BCE.Z	Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille : Référence du noeud=EPG6	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 59 / 103

TRONÇON EP13 - EPG7

Emplacement (AAJ) : Port de commerce
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Référence du noeud 1 (AAD) : EP13
Référence du noeud 2 (AAF) : EPG7
Référence du noeud de départ (AAB) : EP13
Ville ou village (AAN) : SAINT MARTIN
Quartier (AAO) : GALISBAY
Type d'emplacement (AAL) : (Z) Sous un parking
Nom de l'inspecteur (ABH) : Ludovic DERISOUD
Heure d'inspection (ABG) : 20:27
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø200mm
Matériau (ACD) : (AX) PVC-U
Profondeur du noeud de départ (ACH) : 0.90
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Longueur inspectée : 2.50 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur du tronçon : 2.50 ml
Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Point de référence longitudinal (ABC) : (B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Date d'inspection (ABF) : 21/11/2022
Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection




Distance
0.00 ml

Pente
0.0 mm/m

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = EP13

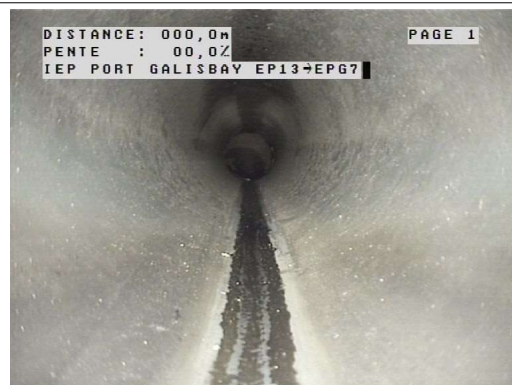

Gravité :         Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 60 / 103

TRONÇON EP13 - EPG7



Distance

2.50 ml

Pente



56.6 mm/m

Compteur

00:00:24

(BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille

Référence du noeud = EPG7

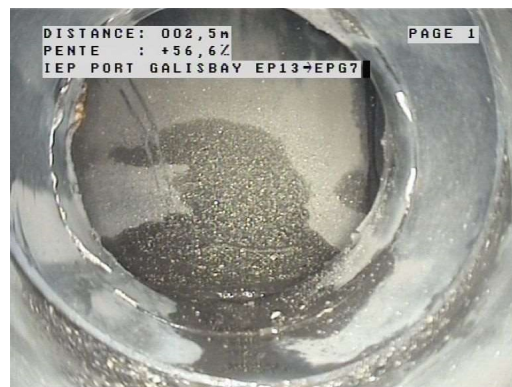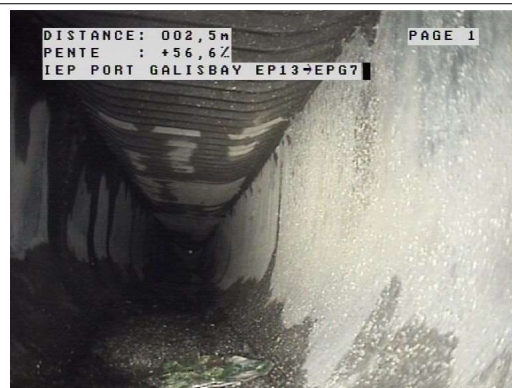

Gravité : +       —

Inspection : =Normal =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 61 / 103

DÉNIVELLATION EP13 - EPG7


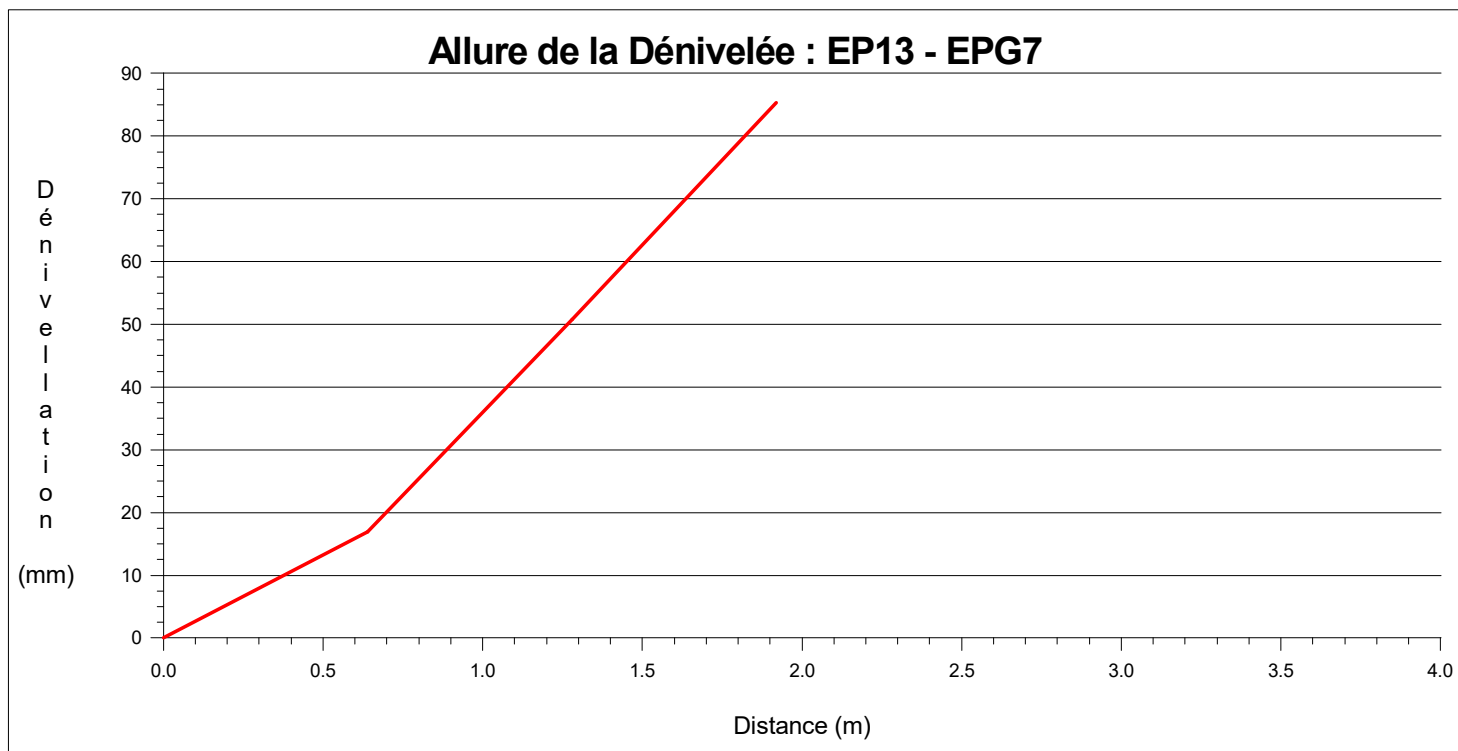


SCHÉMA DU TRONÇON EP13 - EPG7

Observations du tronçon



0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - EP13



2.50 ml (BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille - EPG7

Gravité : +



Départ de l'inspection : ➤

Non inspecté : ■

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 63 / 103

TRONÇON EP14 - EP15

Emplacement (AAJ)	: Port de commerce
Norme (ABA)	: EN13508-2:2003+A1:2011
Référence du noeud 1 (AAD)	: EP14
Référence du noeud 2 (AAF)	: EP15
Référence du noeud de départ (AAB)	: EP14
Ville ou village (AAN)	: SAINT MARTIN
Quartier (AAO)	: GALISBAY
Type d'emplacement (AAL)	: (Z) Sous un parking
Nom de l'inspecteur (ABH)	: Ludovic DERISOUD
Heure d'inspection (ABG)	: 20:46
Objet de l'inspection (ABP)	: (C) Inspection de routine de l'état
Forme (ACA)	: (A) Circulaire
Dimension (ACB)	: Ø400mm
Matériau (ACD)	: (AX) PVC-U
Profondeur du noeud de départ (ACH)	: 0.95
Profondeur du noeud d'arrivée (ACI)	: 1.10
Type de collecteur (ACJ)	: (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK)	: (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Précipitations (ADA)	: (B) Pluie
Régulation de débit (ADC)	: (A) Aucune mesure prise
Longueur inspectée	: 14.20 ml
Longueur non inspectée	: 0.00 ml
Longueur du tronçon	: 14.20 ml
Sens d'écoulement (AAK)	: (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Point de référence longitudinal (ABC)	: (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ
Méthode d'inspection (ABE)	: (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Date d'inspection (ABF)	: 21/11/2022
Nettoyage (ACM)	: (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection



Distance

0.00 ml

Pente


0.0 mm/m

Compteur

00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite

Référence du noeud = EP14

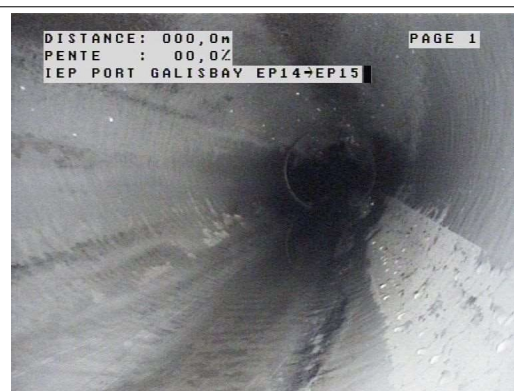

Gravité :         Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire



Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 65 / 103

TRONÇON EP14 - EP15

	Distance	Pente	Compteur
	14.20 ml	-7.9 mm/m	00:01:27


(BCA.E) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 3 heures

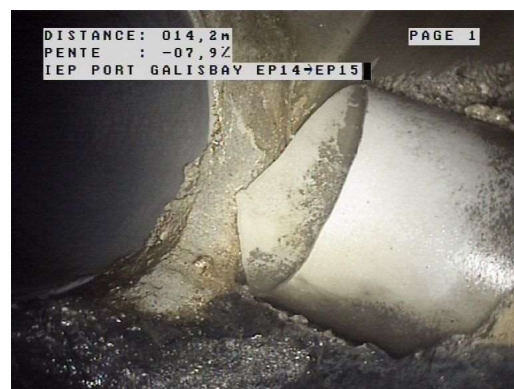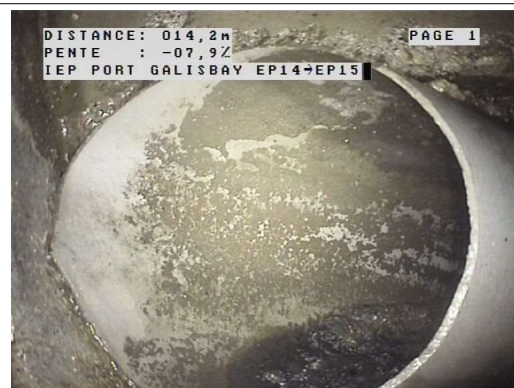

	Distance	Pente	Compteur
	14.20 ml	-7.9 mm/m	00:01:49

(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite

Référence du noeud = EP15

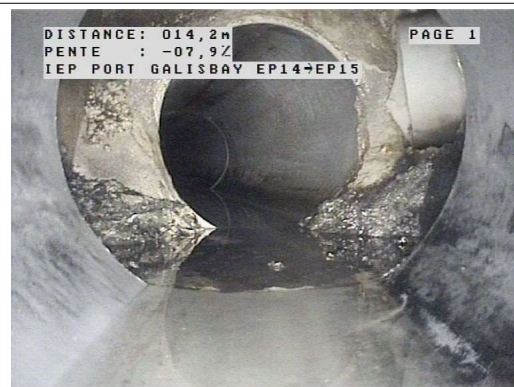

Gravité :        — Inspection : =Normal =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 66 / 103

DÉNIVELLATION EP14 - EP15

Allure de la Dénivelée : EP14 - EP15


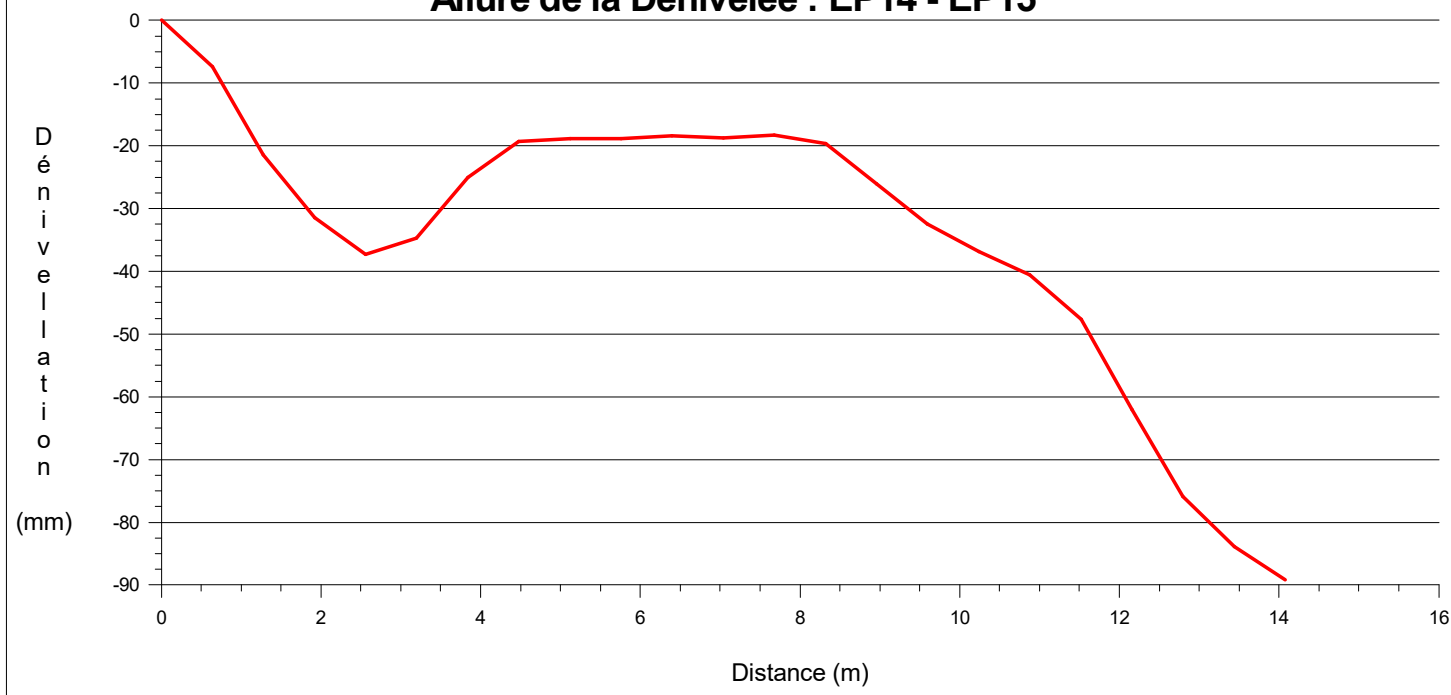


SCHÉMA DU TRONÇON EP14 - EP15

Observations du tronçon



0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - EP14



14.20 ml (BCA.E) Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 3 heures

14.20 ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - EP15

Gravité : **+**        Départ de l'inspection :  Non inspecté : 

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 68 / 103

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP14 - EP15

Tronçon : EP14 - EP15 Longueur du tronçon = 14.20ml		Dimension = Ø400mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP14 → EP15	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP14	
14.20	EP14 → EP15	BCA.E	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 3 heures	
14.20	EP14 → EP15	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=EP15	

Tronçon : Branchement :

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 69 / 103

TRONÇON EP14 - EPG8

Emplacement (AAJ) : Port de commerce
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Référence du noeud 1 (AAD) : EP14
Référence du noeud 2 (AAF) : EPG8
Référence du noeud de départ (AAB) : EP14
Ville ou village (AAN) : SAINT MARTIN
Quartier (AAO) : GALISBAY
Type d'emplacement (AAL) : (Z) Sous un parking
Nom de l'inspecteur (ABH) : Ludovic DERISOUD
Heure d'inspection (ABG) : 17:31
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø200mm
Matériau (ACD) : (AX) PVC-U
Profondeur du noeud de départ (ACH) : 0.78
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Longueur inspectée : 3.70 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur du tronçon : 3.70 ml
Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Point de référence longitudinal (ABC) : (B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Date d'inspection (ABF) : 23/11/2022
Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection



Distance
0.00 ml

Pente
0.0 mm/m

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite

Référence du noeud = EP14

(BCC..A) Courbure du collecteur - vers le haut

(BDC.Z) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Courbure du collecteur trop importante pour passage de la caméra



Gravité :         Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 70 / 103

TRONÇON EP14 - EPG8



Distance

3.70 ml

Pente


0.0 mm/m

Compteur

00:00:24

(BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille

Référence du noeud = EPG8

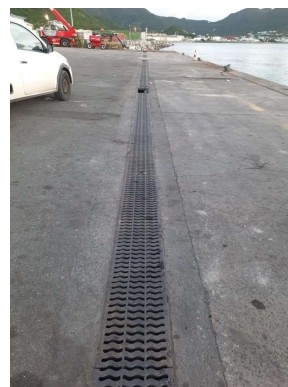

Gravité : +       —

Inspection : =Normal =Inverse


Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 71 / 103

SCHÉMA DU TRONÇON EP14 - EPG8

Observations du tronçon



0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - EP14

0.00 ml (BCC..A) *Courbure du collecteur - vers le haut*

0.00 ml (BDC.Z) *Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Courbure du collecteur trop importante pour passage de la caméra*

3.70 ml (BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille - EPG8

Gravité :  Départ de l'inspection :  Non inspecté : 

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 72 / 103

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP14 - EPG8

Tronçon : EP14 - EPG8 Longueur du tronçon = 3.70ml		Dimension = Ø200mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP14 → EPG8	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP14	
0.00	EP14 → EPG8	BCC..A	Courbure du collecteur - vers le haut	
0.00	EP14 → EPG8	BDC.Z	Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Courbure du collecteur trop importante pour passage de la caméra	
3.70	EP14 → EPG8	BCE.Z	Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille : Référence du noeud=EPG8	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 73 / 103

TRONÇON EP15 - EP16

Emplacement (AAJ) : Port de commerce
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Référence du noeud 1 (AAD) : EP15
Référence du noeud 2 (AAF) : EP16
Référence du noeud de départ (AAB) : EP15
Ville ou village (AAN) : SAINT MARTIN
Quartier (AAO) : GALISBAY
Type d'emplacement (AAL) : (E) Dans un champ
Nom de l'inspecteur (ABH) : Ludovic DERISOUD
Heure d'inspection (ABG) : 16:40
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø400mm
Matériau (ACD) : (AX) PVC-U
Profondeur du noeud de départ (ACH) : 1.10
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Longueur inspectée : 4.80 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur du tronçon : 4.80 ml
Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Date d'inspection (ABF) : 23/11/2022
Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection



Distance
0.00 ml

Pente
0.0 mm/m

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = EP15



Gravité :         Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 74 / 103

TRONÇON EP15 - EP16

	Distance	Pente	Compteur
	0.00 ml	0.0 mm/m	00:00:01
(BDD.C) Niveau d'eau - troubles (Début 1) Niveau = 5%			
			

	Distance	Pente	Compteur
	4.80 ml	6.5 mm/m	00:01:03
(BDD.C) Niveau d'eau - troubles (Fin 1) Niveau = 5% (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = EP16 (BDB) Tampon inaccessible			
 			

Gravité :        — Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 75 / 103

DÉNIVELLATION EP15 - EP16

Allure de la Dénivelée : EP15 - EP16


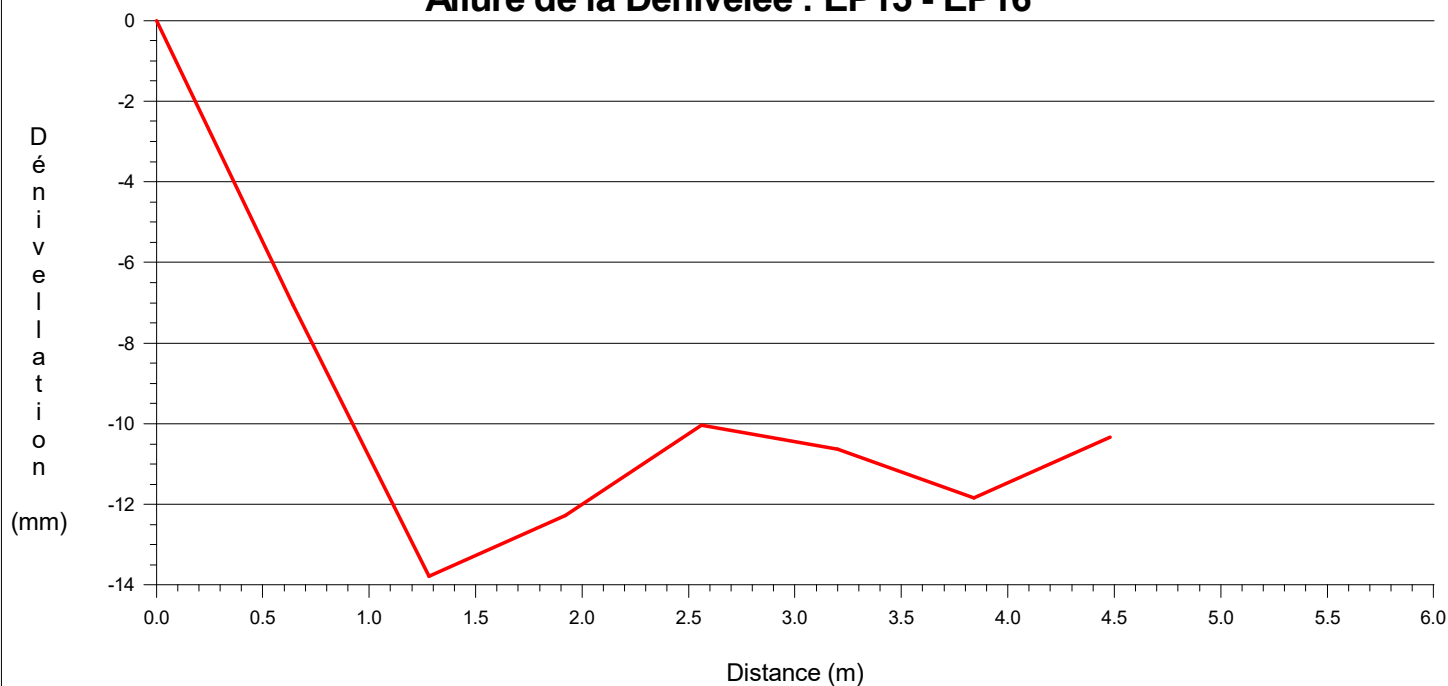


SCHÉMA DU TRONÇON EP15 - EP16

Observations du tronçon

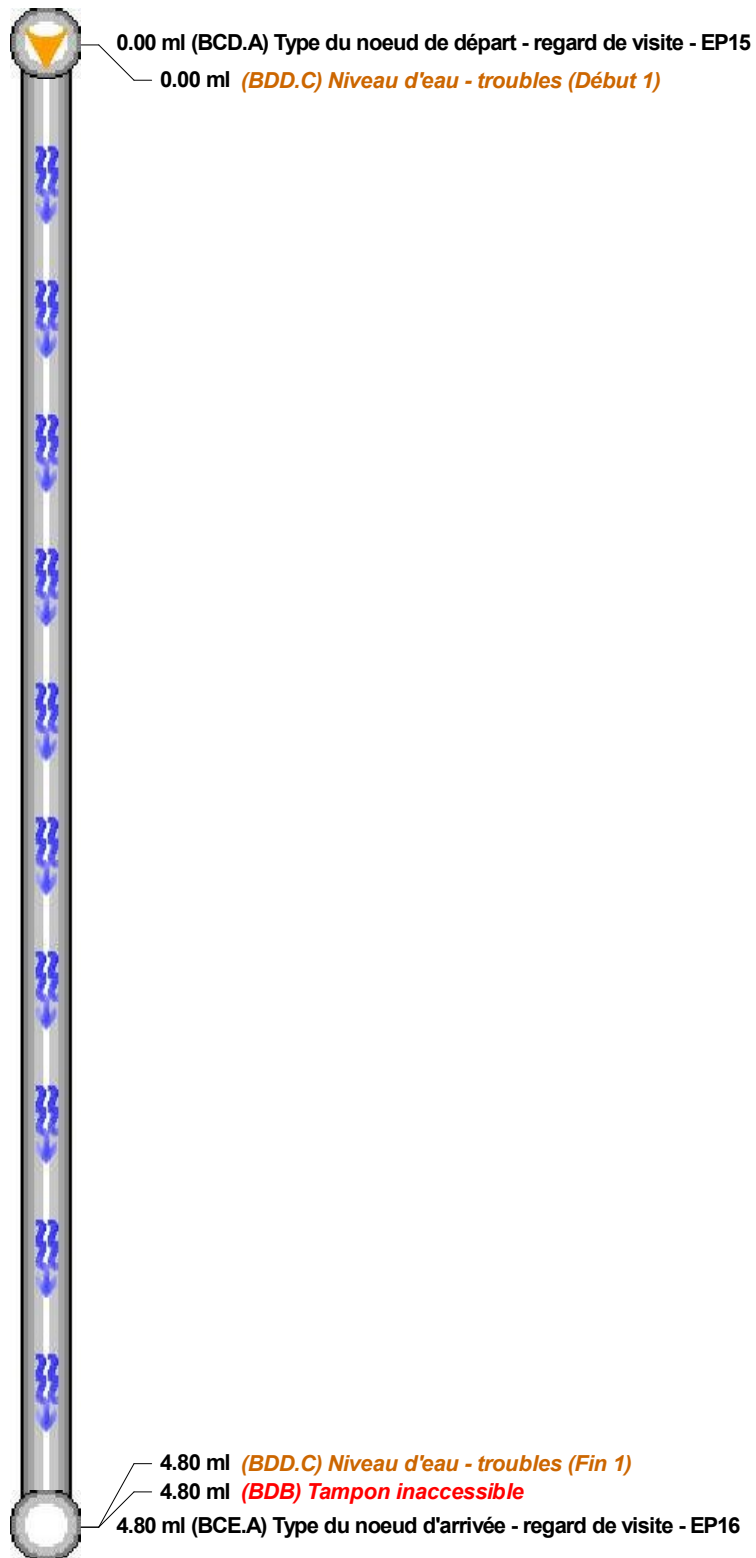

Gravité : **+**        Départ de l'inspection :  Non inspecté : 

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 77 / 103

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP15 - EP16

Tronçon : EP15 - EP16 Longueur du tronçon = 4.80ml		Dimension = Ø400mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP15 → EP16	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP15	
0.00	EP15 → EP16	BDD.C	Niveau d'eau - troubles (Début 1) : Niveau=5%	
4.80	EP15 → EP16	BDD.C	Niveau d'eau - troubles (Fin 1) : Niveau=5%	
4.80	EP15 → EP16	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=EP16	
4.80	EP15 → EP16	BDB	Tampon inaccessible	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 78 / 103

TRONÇON EP15 - EPG9

Emplacement (AAJ) : Port de commerce
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Référence du noeud 1 (AAD) : EP15
Référence du noeud 2 (AAF) : EPG9
Référence du noeud de départ (AAB) : EP15
Ville ou village (AAN) : SAINT MARTIN
Quartier (AAO) : GALISBAY
Type d'emplacement (AAL) : (Z) Sous un parking
Nom de l'inspecteur (ABH) : Ludovic DERISOUD
Heure d'inspection (ABG) : 17:15
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø200mm
Matériau (ACD) : (AX) PVC-U
Profondeur du noeud de départ (ACH) : 0.94
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Longueur inspectée : 10.20 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur du tronçon : 10.20 ml
Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Point de référence longitudinal (ABC) : (B) L'intrados du tronçon à l'intérieur du noeud de départ
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Date d'inspection (ABF) : 23/11/2022
Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection



Distance
0.00 ml

Pente
0.0 mm/m

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = EP15



Gravité :        — Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY


N° de Page : 79 / 103

TRONÇON EP15 - EPG9

	Distance	Pente	Compteur	DISTANCE: 005,5m PENTE : +21,0% IEP PORT GALISBAY EP15→EPG9 PAGE 1 
	2.80 ml	49.6 mm/m	00:00:21	
(BAF.K.A) Dégradation de surface - poinçonnement (renflement interne) - mécanique à 8 heures				

	Distance	Pente	Compteur	DISTANCE: 006,1m PENTE : +18,2% IEP PORT GALISBAY EP15→EPG9 PAGE 1 
	6.10 ml	18.2 mm/m	00:01:19	
(BAF.K.A) Dégradation de surface - poinçonnement (renflement interne) - mécanique à 8 heures				

	Distance	Pente	Compteur	DISTANCE: 007,9m PENTE : +26,6% IEP PORT GALISBAY EP15→EPG9 PAGE 1 
	7.90 ml	26.6 mm/m	00:01:47	
(BAA.A) Déformation - verticale (Début 1)				

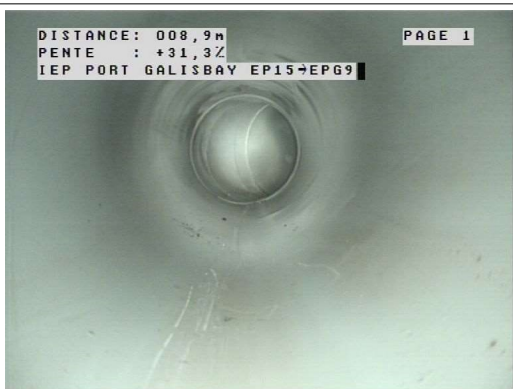	Distance	Pente	Compteur	DISTANCE: 008,9m PENTE : +31,3% IEP PORT GALISBAY EP15→EPG9 PAGE 1 
	8.90 ml	31.3 mm/m	00:01:59	
(BAA.A) Déformation - verticale (Fin 1)				


Gravité :        — Inspection : =Normal =Inverse



Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 80 / 103

TRONÇON EP15 - EPG9

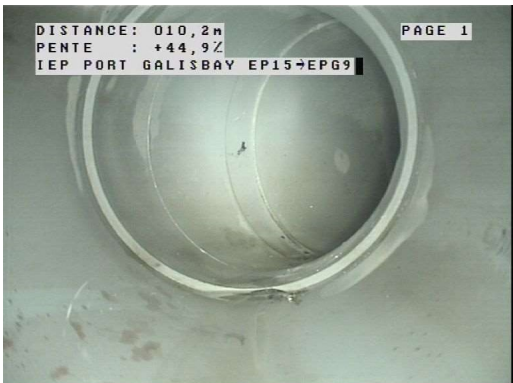	Distance	Pente	Compteur	
	10.20 ml	44.9 mm/m	00:02:17	
(BCC.B) Courbure du collecteur - vers la droite Angle de déviation = 45° (BDC.Z) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Courbure du collecteur trop importante pour passage de la caméra				
				

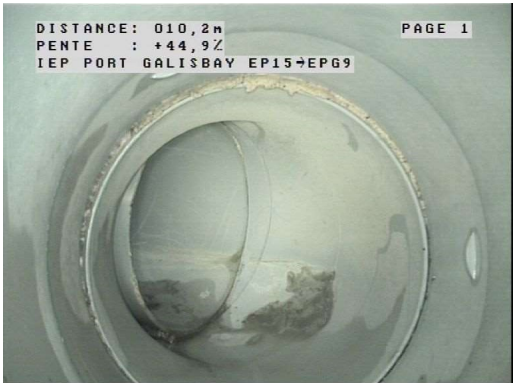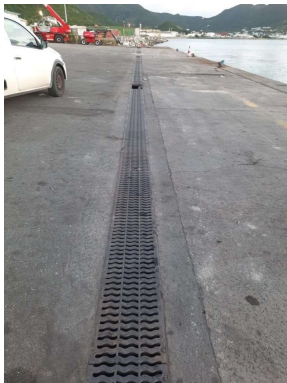	Distance	Pente	Compteur	
	10.20 ml	44.9 mm/m	00:02:27	
(BCE.Z) Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille Référence du noeud = EP9				
				 

Gravité :        — Inspection : =Normal =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 81 / 103

DÉNIVELLATION EP15 - EPG9

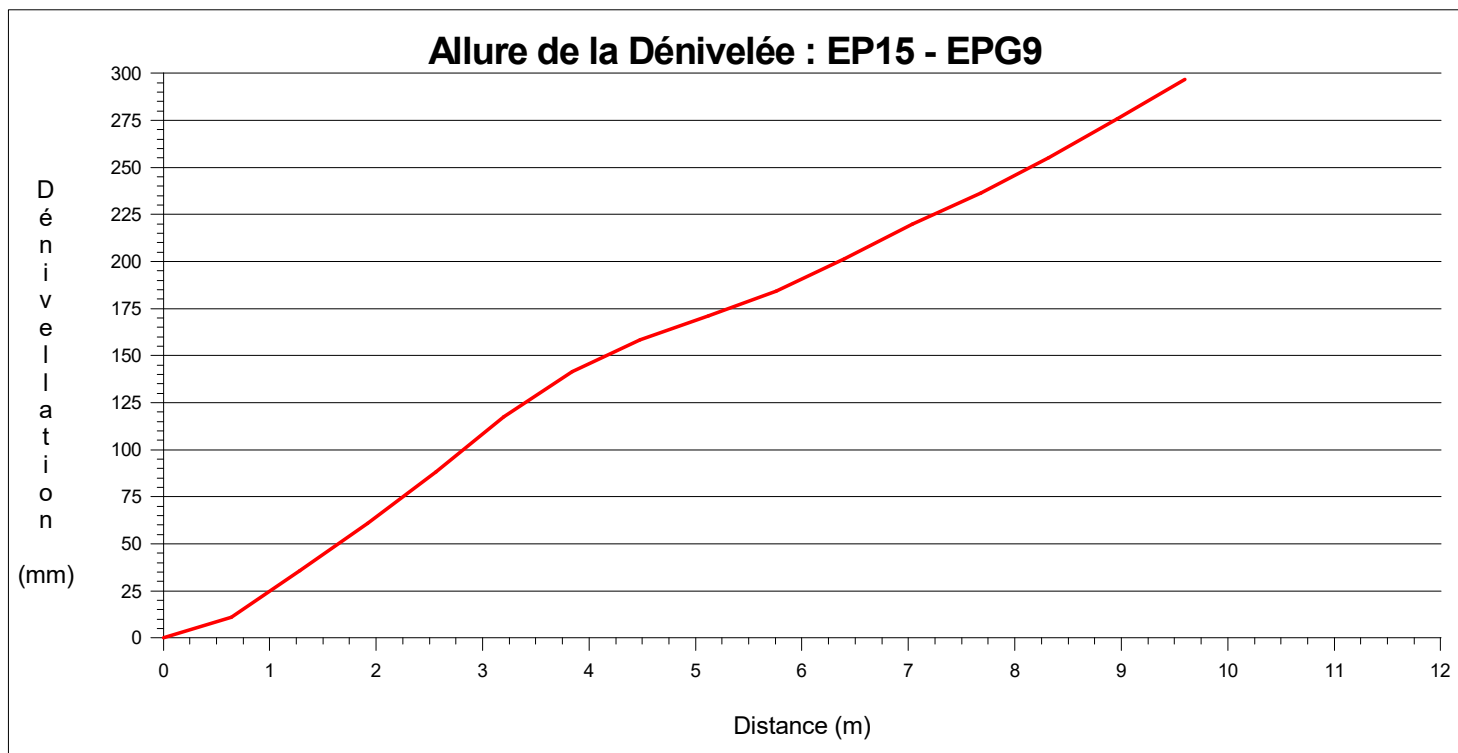


SCHÉMA DU TRONÇON EP15 - EPG9

Observations du tronçon



Gravité : Départ de l'inspection : Non inspecté :

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 83 / 103

SYNTHÈSE DU TRONÇON EP15 - EPG9

Tronçon : EP15 - EPG9 Longueur du tronçon = 10.20ml		Dimension = Ø200mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP15 → EPG9	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP15	
2.80	EP15 → EPG9	BAF.K.A	Dégradation de surface - poinçonnement (renflement interne) - mécanique à 8 heures	
6.10	EP15 → EPG9	BAF.K.A	Dégradation de surface - poinçonnement (renflement interne) - mécanique à 8 heures	
7.90	EP15 → EPG9	BAA.A	Déformation - verticale (Début 1)	
8.90	EP15 → EPG9	BAA.A	Déformation - verticale (Fin 1)	
10.20	EP15 → EPG9	BCC.B	Courbure du collecteur - vers la droite : Angle de déviation=45°	
10.20	EP15 → EPG9	BDC.Z	Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Courbure du collecteur trop importante pour passage de la caméra	
10.20	EP15 → EPG9	BCE.Z	Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille : Référence du noeud=EP9	

Tronçon : ☐ Branchement : ☐

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 84 / 103

TRONÇON EP16 - EPDES

Emplacement (AAJ) : Port de commerce
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Référence du noeud 1 (AAD) : EP16
Référence du noeud 2 (AAF) : EPDES
Référence du noeud de départ (AAB) : EP16
Ville ou village (AAN) : SAINT MARTIN
Quartier (AAO) : GALISBAY
Type d'emplacement (AAL) : (E) Dans un champ
Nom de l'inspecteur (ABH) : Ludovic DERISOUD
Heure d'inspection (ABG) : 16:55
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø400mm
Matériau (ACD) : (AX) PVC-U
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Longueur inspectée : 0.00 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur du tronçon : 0.00 ml
Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Date d'inspection (ABF) : 23/11/2022
Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection



Distance
0.00 ml


Pente
0.0 mm/m

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite

Référence du noeud = EP16

(BDC.Z) Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Tampon inaccessible

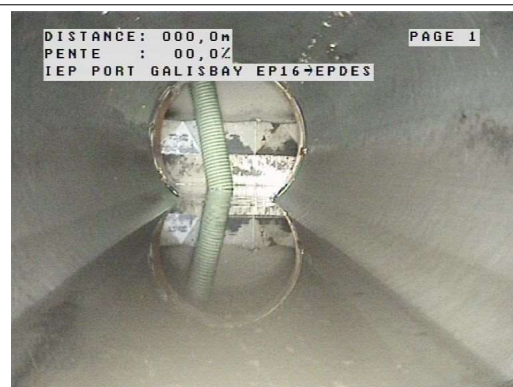

Gravité :         Inspection :  =Normal  =Inverse


Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 85 / 103

SCHÉMA DU TRONÇON EP16 - EPDES

Observations du tronçon

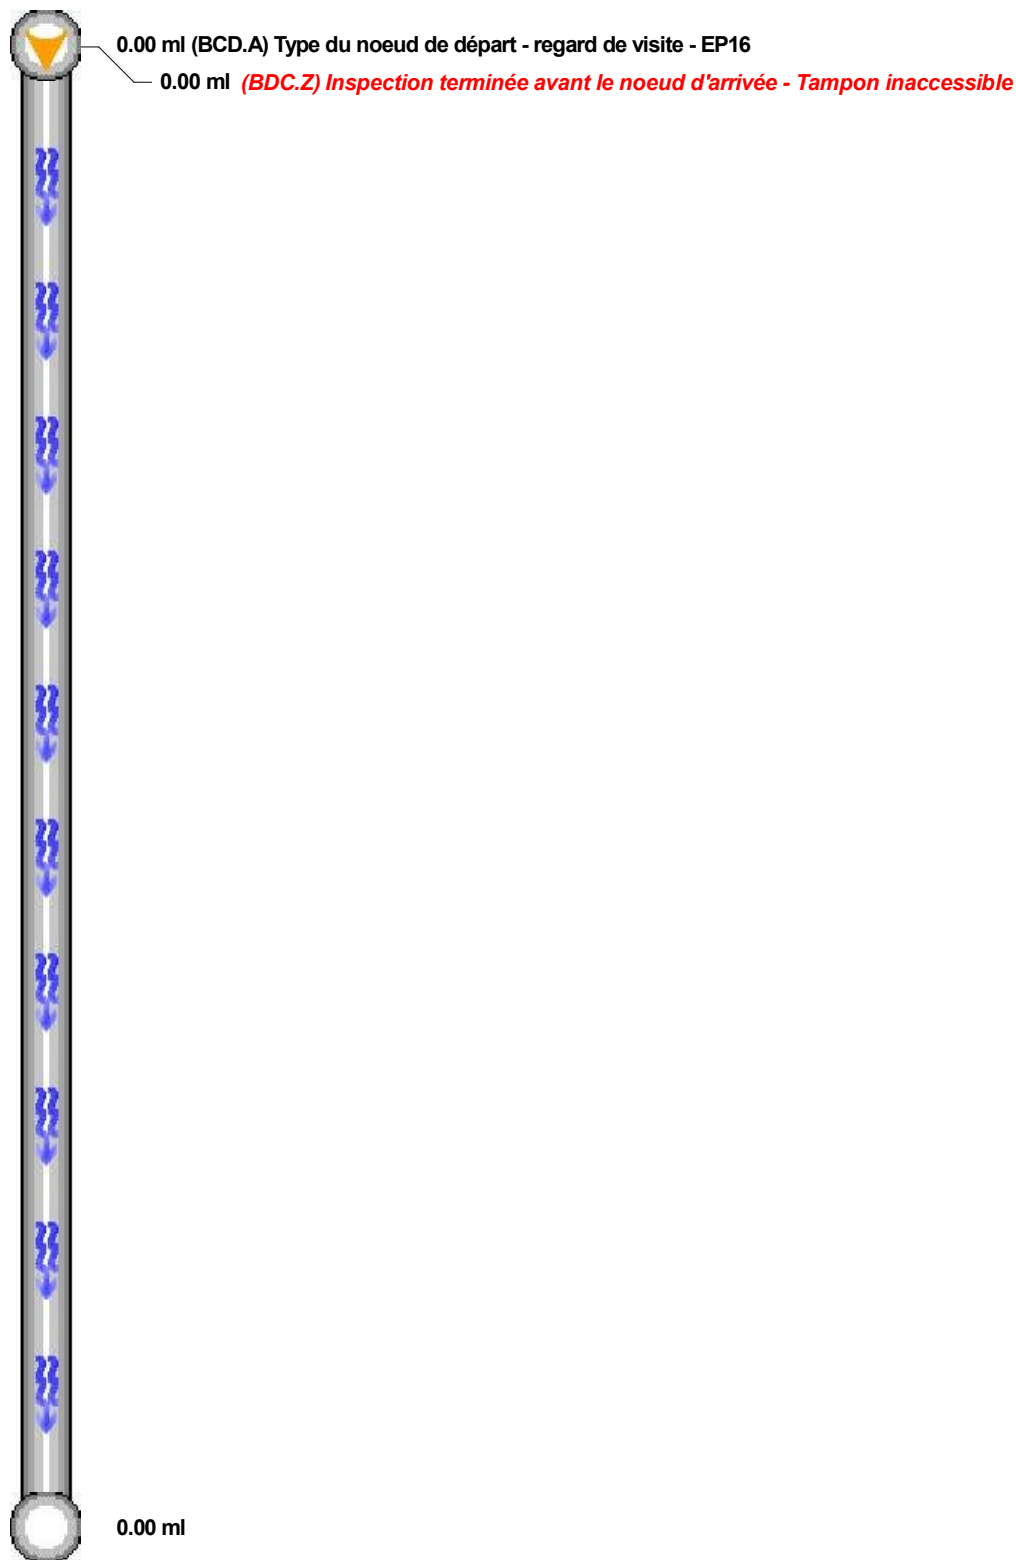

Gravité :        — Départ de l'inspection :  Non inspecté : 

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 86 / 103

TRONÇON EP21 - EP20

Emplacement (AAJ) : Port de commerce
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Référence du noeud 1 (AAD) : EP21
Référence du noeud 2 (AAF) : EP20
Référence du noeud de départ (AAB) : EP21
Ville ou village (AAN) : SAINT MARTIN
Quartier (AAO) : GALISBAY
Type d'emplacement (AAL) : (Z) Sous un parking
Nom de l'inspecteur (ABH) : Ludovic DERISOUD
Heure d'inspection (ABG) : 18:03
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø800mm
Matériau (ACD) : (AX) PVC-U
Profondeur du noeud de départ (ACH) : 2.02
Profondeur du noeud d'arrivée (ACI) : 1.10
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Longueur inspectée : 13.40 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur du tronçon : 13.40 ml
Sens d'écoulement (AAK) : (B) Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Date d'inspection (ABF) : 23/11/2022
Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection




Distance
0.00 ml

Pente
0.0 mm/m

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = EP21

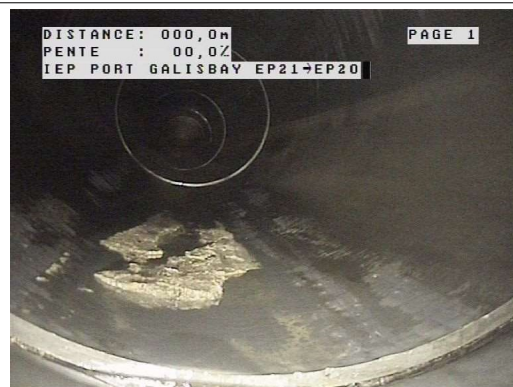

Gravité :        — Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire


Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 88 / 103

TRONÇON EP21 - EP20


	Distance	Pente	Compteur
	13.40 ml	58.9 mm/m	00:01:50

(BCA.Z) Raccordement du branchement - Grille Avaloir à 9 heures

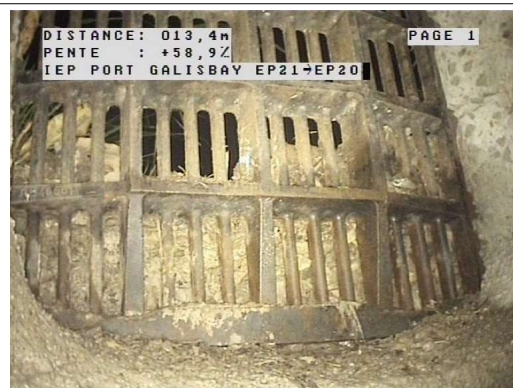

	Distance	Pente	Compteur
	13.40 ml	58.9 mm/m	00:02:06

(BDB) Tampon Grille Avaloir

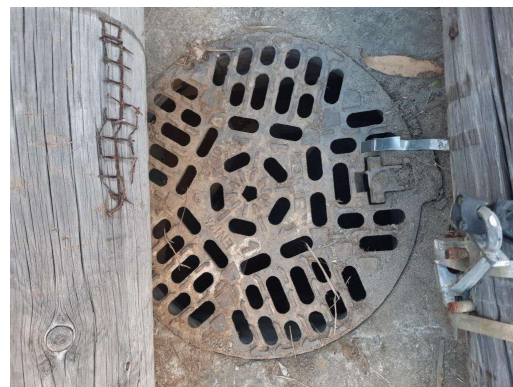


Gravité :        — Inspection : =Normal =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 89 / 103

TRONÇON EP21 - EP20

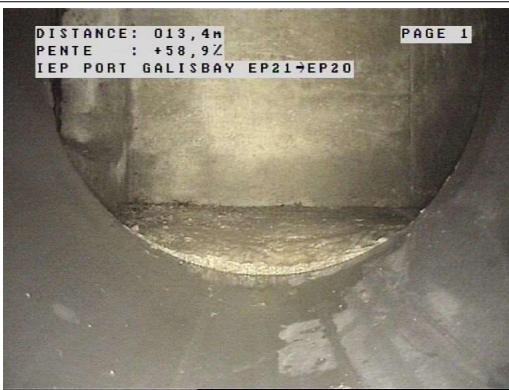	Distance	Pente	Compteur
	13.40 ml	58.9 mm/m	00:02:17
(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = EP20			
			

Gravité :        — Inspection : =Normal =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 90 / 103

DÉNIVELLATION EP21 - EP20


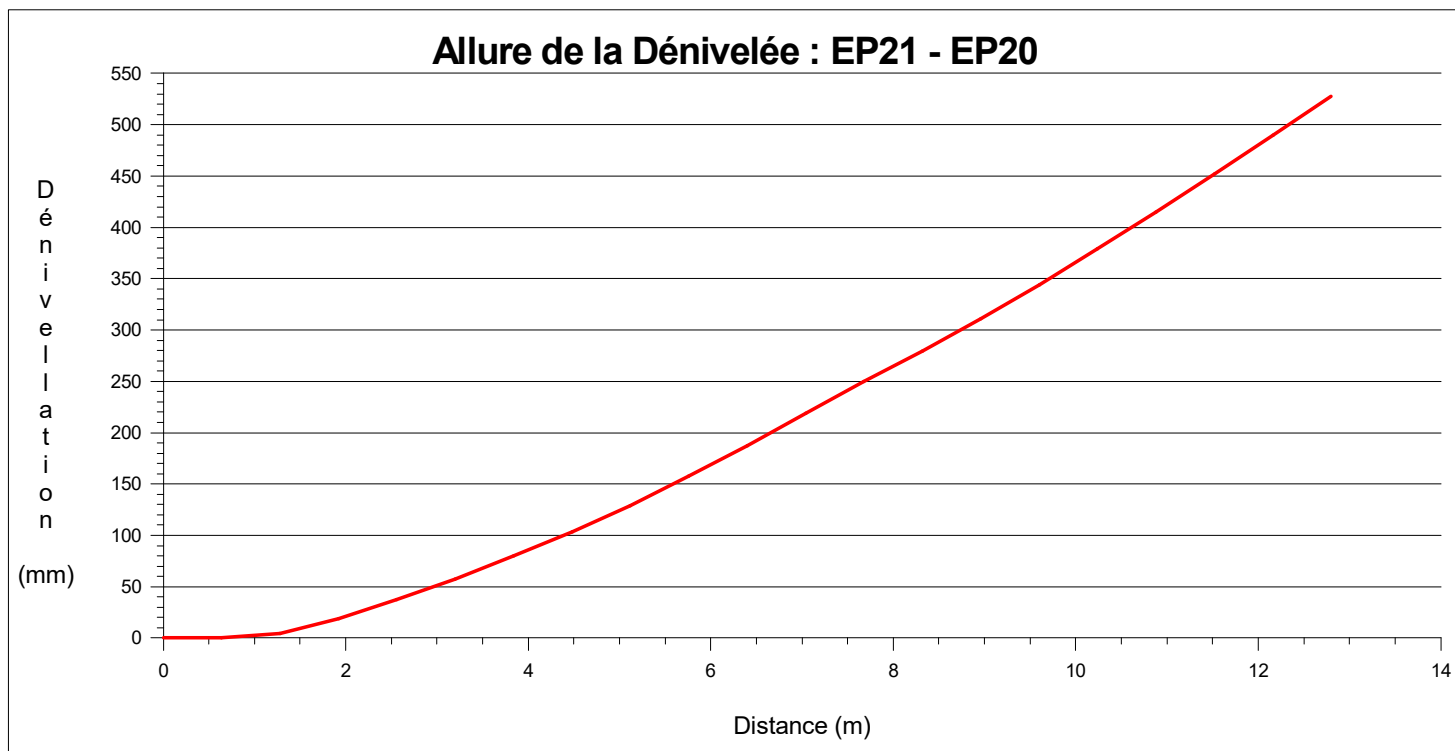


SCHÉMA DU TRONÇON EP21 - EP20

Observations du tronçon



0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - EP21



13.40 ml (BCA.Z) Raccordement du branchement - Grille Avaloir à 9 heures

13.40 ml (BDB) Tampon Grille Avaloir

13.40 ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - EP20

Gravité : +



Départ de l'inspection : ➡

Non inspecté : ■

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 92 / 103

TRONÇON EP21 - EP22

Emplacement (AAJ) : Port de commerce
Norme (ABA) : EN13508-2:2003+A1:2011
Référence du noeud 1 (AAD) : EP21
Référence du noeud 2 (AAF) : EP22
Référence du noeud de départ (AAB) : EP21
Ville ou village (AAN) : SAINT MARTIN
Quartier (AAO) : GALISBAY
Type d'emplacement (AAL) : (A) Sous une route
Nom de l'inspecteur (ABH) : Ludovic DERISOUD
Heure d'inspection (ABG) : 18:26
Objet de l'inspection (ABP) : (C) Inspection de routine de l'état
Forme (ACA) : (A) Circulaire
Dimension (ACB) : Ø800mm
Matériau (ACD) : (AX) PVC-U
Profondeur du noeud de départ (ACH) : 2.02
Profondeur du noeud d'arrivée (ACI) : 2.21
Type de collecteur (ACJ) : (A) Collecteur gravitaire
Utilisation du collecteur (ACK) : (B) Collecteur d'eaux de surface uniquement
Précipitations (ADA) : (A) Pas de précipitations
Régulation de débit (ADC) : (A) Aucune mesure prise
Longueur inspectée : 10.50 ml
Longueur non inspectée : 0.00 ml
Longueur du tronçon : 10.50 ml
Sens d'écoulement (AAK) : (A) Inspection dans le sens de l'écoulement
Point de référence longitudinal (ABC) : (C) Le centre du regard de visite ou de la boîte d'inspection de départ
Méthode d'inspection (ABE) : (B) Inspection par une caméra circulant dans la canalisation
Date d'inspection (ABF) : 23/11/2022
Nettoyage (ACM) : (A) Le collecteur a été nettoyé avant l'inspection




Distance
0.00 ml

Pente
0.0 mm/m

Compteur
00:00:00

(BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite
Référence du noeud = EP21

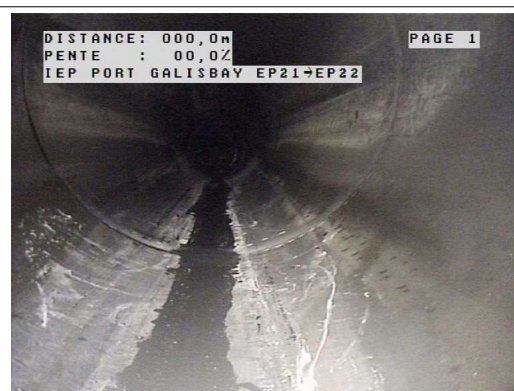


Gravité :         Inspection :  =Normal  =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 94 / 103

TRONÇON EP21 - EP22

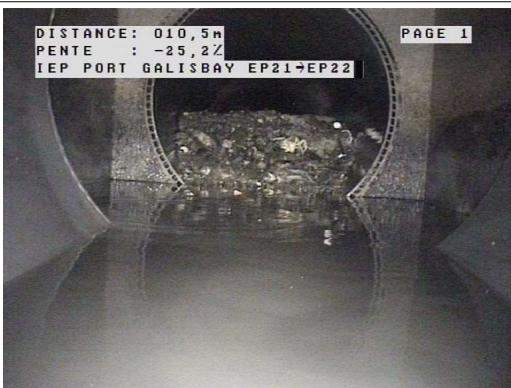	Distance	Pente	Compteur
	10.50 ml	-25.2 mm/m	00:01:13
(BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite Référence du noeud = EP22			
 DISTANCE: 010,5m PENTE : -25,2% IEP PORT GALISBAY EP21-EP22 PAGE 1 			

Gravité :        — Inspection : =Normal =Inverse

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 95 / 103

DÉNIVELLATION EP21 - EP22


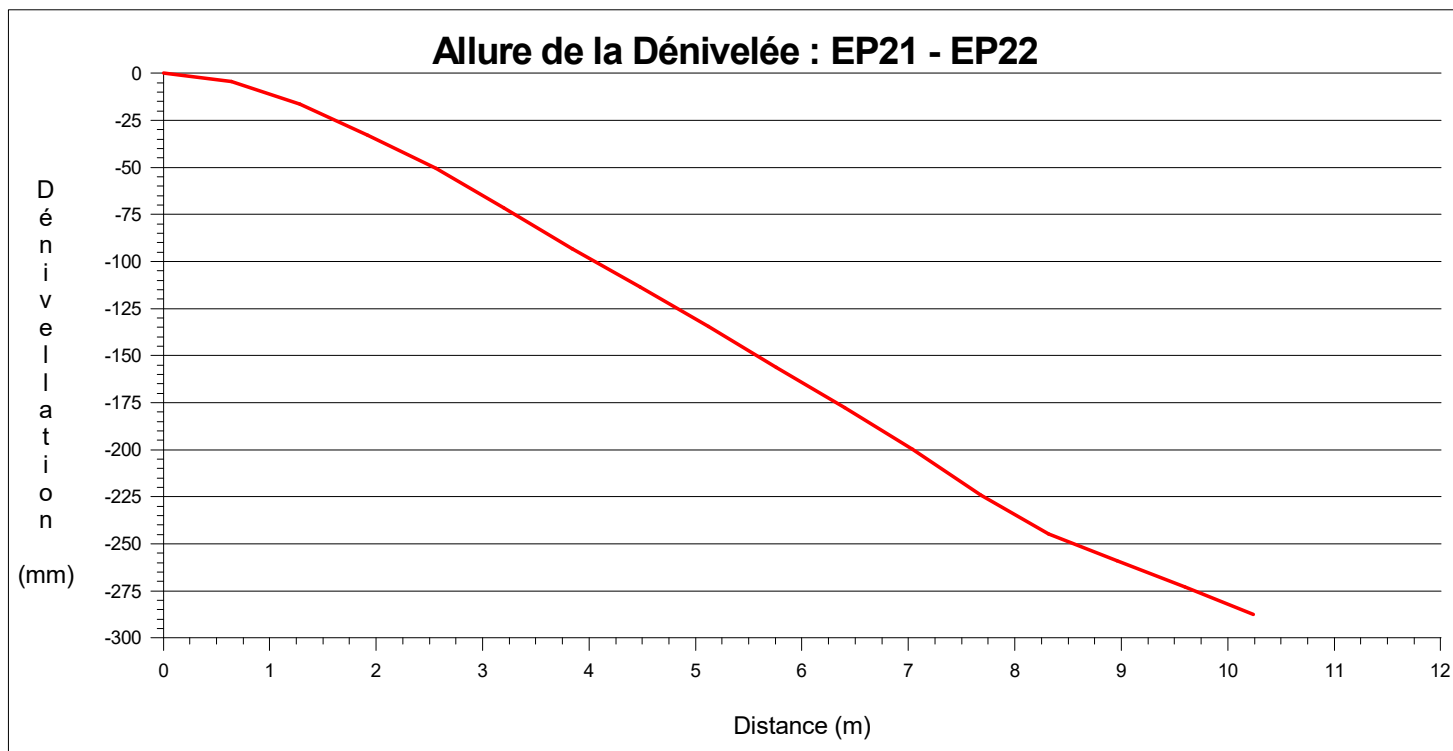


SCHÉMA DU TRONÇON EP21 - EP22

Observations du tronçon



0.00 ml (BCD.A) Type du noeud de départ - regard de visite - EP21



10.50 ml (BCE.A) Type du noeud d'arrivée - regard de visite - EP22

Gravité :        

Départ de l'inspection : 

Non inspecté : 

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
 Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 97 / 103

SYNTHÈSE

Tronçon : EP10 - EP11 Longueur du tronçon = 15.60ml		Dimension = Ø400mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP10 → EP11	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP10	
15.50	EP10 → EP11	BCA.E	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 4 heures	
15.60	EP10 → EP11	BCA.E	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 3 heures	
15.60	EP10 → EP11	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=EP11	
Tronçon : EP10 - EPG1 Longueur du tronçon = 10.50ml		Dimension = Ø200mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP10 → EPG1	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP10	
7.60	EP10 → EPG1	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=5%	
8.70	EP10 → EPG1	BBC.A	Dépôts - fin : Epaisseur des dépôts=5%	
10.50	EP10 → EPG1	BCE.Z	Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille : Référence du noeud=EPG1	
Tronçon : EP11 - EP12 Longueur du tronçon = 20.10ml		Dimension = Ø400mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP11 → EP12	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP11	
0.00	EP11 → EP12	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=5%	
1.30	EP11 → EP12	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) : Niveau=5%	
13.00	EP11 → EP12	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 2) : Niveau=5%	
19.30	EP11 → EP12	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 2) : Niveau=5%	
20.10	EP11 → EP12	BCA.E	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 4 heures	
20.10	EP11 → EP12	BCA.E	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 3 heures	
20.10	EP11 → EP12	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=EP12	
Tronçon : EP11 - EPG2 Longueur du tronçon = 10.10ml		Dimension = Ø200mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP11 → EPG2	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP11	
1.40	EP11 → EPG2	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=10%	
2.70	EP11 → EPG2	BDD.C	Niveau d'eau - troubles (Début 2) : Niveau=40%	
5.30	EP11 → EPG2	BDD.C	Niveau d'eau - troubles (Fin 2) : Niveau=40%	
6.00	EP11 → EPG2	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) : Niveau=10%	
8.60	EP11 → EPG2	BAF.K.A	Dégradation de surface - poinçonnement (renflement interne) - mécanique à 7 heures	
10.10	EP11 → EPG2	BCC.A	Courbure du collecteur - vers la gauche : Angle de déviation=45°	
10.10	EP11 → EPG2	BDC.Z	Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Courbure du collecteur trop importante pour passage de la caméra	
10.10	EP11 → EPG2	BCE.Z	Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille : Référence du noeud=EPG2	
Tronçon : EP11 - EPG3 Longueur du tronçon = 6.40ml		Dimension = Ø200mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP11 → EPG3	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP11	
0.00	EP11 → EPG3	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=10%	
0.10	EP11 → EPG3	BDD.C	Niveau d'eau - troubles (Début 2) : Niveau=50%	
2.90	EP11 → EPG3	BDD.C	Niveau d'eau - troubles (Fin 2) : Niveau=50%	
4.00	EP11 → EPG3	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Fin 1) : Niveau=10%	
6.40	EP11 → EPG3	BCE.Z	Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille : Référence du noeud=EPG3	

Gravité : Tronçon : Branchement : Regard :

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 99 / 103

SYNTHÈSE

Tronçon : EP12 - EP13 Longueur du tronçon = 19.80ml		Dimension = Ø400mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP12 → EP13	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP12	
19.70	EP12 → EP13	BCA.E	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 4 heures	
19.80	EP12 → EP13	BCA.E	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 3 heures	
19.80	EP12 → EP13	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=EP13	
Tronçon : EP12 - EPG4 Longueur du tronçon = 6.40ml		Dimension = Ø200mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP12 → EPG4	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP12	
6.40	EP12 → EPG4	BCE.Z	Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille : Référence du noeud=EPG4	
Tronçon : EP12 - EPG5 Longueur du tronçon = 6.10ml		Dimension = Ø200mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP12 → EPG5	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP12	
6.10	EP12 → EPG5	BCE.Z	Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille : Référence du noeud=EPG5	
Tronçon : EP13 - EP14 Longueur du tronçon = 19.20ml		Dimension = Ø400mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP13 → EP14	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP13	
14.50	EP13 → EP14	BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible) (Début 1) : Niveau=5%	
19.20	EP13 → EP14	BCA.E	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 3 heures	
19.20	EP13 → EP14	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=14	
Tronçon : EP13 - EPG6 Longueur du tronçon = 0.90ml		Dimension = Ø200mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP13 → EPG6	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP13	
0.90	EP13 → EPG6	BCC.B	Courbure du collecteur - vers la droite : Angle de déviation=45°	
0.90	EP13 → EPG6	BDC.Z	Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Courbure du collecteur trop importante pour passage de la caméra	
0.90	EP13 → EPG6	BCE.Z	Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille : Référence du noeud=EPG6	
Tronçon : EP13 - EPG7 Longueur du tronçon = 2.50ml		Dimension = Ø200mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP13 → EPG7	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP13	
2.50	EP13 → EPG7	BCE.Z	Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille : Référence du noeud=EPG7	
Tronçon : EP14 - EP15 Longueur du tronçon = 14.20ml		Dimension = Ø400mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP14 → EP15	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP14	
14.20	EP14 → EP15	BCA.E	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné à 3 heures	
14.20	EP14 → EP15	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=EP15	

Gravité :  Tronçon :  Branchement :  Regard : 

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 100 / 103

SYNTHÈSE

Tronçon : EP14 - EPG8 Longueur du tronçon = 3.70ml		Dimension = Ø200mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP14 → EPG8	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP14	
0.00	EP14 → EPG8	BCC..A	Courbure du collecteur - vers le haut	
0.00	EP14 → EPG8	BDC.Z	Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Courbure du collecteur trop importante pour passage de la caméra	
3.70	EP14 → EPG8	BCE.Z	Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille : Référence du noeud=EPG8	
Tronçon : EP15 - EP16 Longueur du tronçon = 4.80ml		Dimension = Ø400mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP15 → EP16	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP15	
0.00	EP15 → EP16	BDD.C	Niveau d'eau - troubles (Début 1) : Niveau=5%	
4.80	EP15 → EP16	BDD.C	Niveau d'eau - troubles (Fin 1) : Niveau=5%	
4.80	EP15 → EP16	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=EP16	
4.80	EP15 → EP16	BDB	Tampon inaccessible	
Tronçon : EP15 - EPG9 Longueur du tronçon = 10.20ml		Dimension = Ø200mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP15 → EPG9	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP15	
2.80	EP15 → EPG9	BAF.K.A	Dégradation de surface - poinçonnement (renflement interne) - mécanique à 8 heures	
6.10	EP15 → EPG9	BAF.K.A	Dégradation de surface - poinçonnement (renflement interne) - mécanique à 8 heures	
7.90	EP15 → EPG9	BAA.A	Déformation - verticale (Début 1)	
8.90	EP15 → EPG9	BAA.A	Déformation - verticale (Fin 1)	
10.20	EP15 → EPG9	BCC.B	Courbure du collecteur - vers la droite : Angle de déviation=45°	
10.20	EP15 → EPG9	BDC.Z	Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Courbure du collecteur trop importante pour passage de la caméra	
10.20	EP15 → EPG9	BCE.Z	Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille : Référence du noeud=EP9	
Tronçon : EP16 - EPDES Longueur du tronçon = 0.00ml		Dimension = Ø400mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP16 → EPDES	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP16	
0.00	EP16 → EPDES	BDC.Z	Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Tampon inaccessible	
Tronçon : EP21 - EP20 Longueur du tronçon = 13.40ml		Dimension = Ø800mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens opposé de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP21 → EP20	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP21	
13.40	EP21 → EP20	BCA.Z	Raccordement du branchement - Grille Avaloir à 9 heures	
13.40	EP21 → EP20	BDB	Tampon Grille Avaloir	
13.40	EP21 → EP20	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=EP20	
Tronçon : EP21 - EP22 Longueur du tronçon = 10.50ml		Dimension = Ø800mm Collecteur d'eaux de surface uniquement		PVC-U Inspection dans le sens de l'écoulement
Distance	Sens d'inspection	Code	Observations	
0.00	EP21 → EP22	BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite : Référence du noeud=EP21	
10.50	EP21 → EP22	BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite : Référence du noeud=EP22	

Gravité :  Tronçon :  Branchement :  Regard : 

Client : ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE SAINT-MARTIN
Chantier : Inspection télévisée du réseau d'eaux pluviales - Quai secondaire

Référence du dossier : IEP PORT GALISBAY

N° de Page : 101 / 103

INVENTAIRE DES OBSERVATIONS

Code	Observations	Quantité
BAA.A	Déformation - verticale	1
	EP15 - EPG9	
BAF.K.A	Dégradation de surface - poinçonnement (renflement interne) - mécanique	3
	EP11 - EPG2	1
	EP15 - EPG9	2
BBC.A	Dépôts - fin	1
	EP10 - EPG1	
BCA.E	Raccordement du branchement - piquage direct - buriné	8
	EP10 - EP11	2
	EP11 - EP12	2
	EP12 - EP13	2
	EP13 - EP14	1
	EP14 - EP15	1
BCA.Z	Raccordement du branchement - Grille Avaloir	1
	EP21 - EP20	
BCC..A	Courbure du collecteur - vers le haut	1
	EP14 - EPG8	
BCC.A	Courbure du collecteur - vers la gauche	1
	EP11 - EPG2	
BCC.B	Courbure du collecteur - vers la droite	2
	EP13 - EPG6	1
	EP15 - EPG9	1
BCD.A	Type du noeud de départ - regard de visite	18
	EP10 - EP11	1
	EP10 - EPG1	1
	EP11 - EP12	1
	EP11 - EPG2	1
	EP11 - EPG3	1
	EP12 - EP13	1
	EP12 - EPG4	1
	EP12 - EPG5	1
	EP13 - EP14	1
	EP13 - EPG6	1
	EP13 - EPG7	1
	EP14 - EP15	1
	EP14 - EPG8	1
	EP15 - EP16	1
	EP15 - EPG9	1
	EP16 - EPDES	1
	EP21 - EP20	1
	EP21 - EP22	1
BCE.A	Type du noeud d'arrivée - regard de visite	8
	EP10 - EP11	1
	EP11 - EP12	1
	EP12 - EP13	1
	EP13 - EP14	1
	EP14 - EP15	1
	EP15 - EP16	1
	EP21 - EP20	1
	EP21 - EP22	1
BCE.Z	Type du noeud d'arrivée - Caniveau Grille	9
	EP10 - EPG1	1
	EP11 - EPG2	1
	EP11 - EPG3	1
	EP12 - EPG4	1
	EP12 - EPG5	1
	EP13 - EPG6	1
	EP13 - EPG7	1
	EP14 - EPG8	1
	EP15 - EPG9	1

INVENTAIRE DES OBSERVATIONS

Code	Observations	Quantité
BDB	Tampon Grille Avaloir	1
	EP21 - EP20	
BDB	Tampon inaccessible	1
	EP15 - EP16	
BDC.Z	Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Courbure du collecteur trop importante pour passage de la caméra	4
	EP11 - EPG2	1
	EP13 - EPG6	1
	EP14 - EPG8	1
	EP15 - EPG9	1
BDC.Z	Inspection terminée avant le noeud d'arrivée - Tampon inaccessible	1
	EP16 - EPDES	
BDD.A	Niveau d'eau - effluent clair (radier visible)	6
	EP10 - EPG1	1
	EP11 - EP12	2
	EP11 - EPG2	1
	EP11 - EPG3	1
	EP13 - EP14	1
BDD.C	Niveau d'eau - troubles	3
	EP11 - EPG2	1
	EP11 - EPG3	1
	EP15 - EP16	1
Nombre total de raccordement		9
	EP21 - EP20	1
	EP14 - EP15	1
	EP13 - EP14	1
	EP12 - EP13	2
	EP11 - EP12	2
	EP10 - EP11	2
